



# GMP验证方案

## GMP VERIFICATION PLAN

**验证企业:** 北京福元医药股份有限公司

**验证地址:** 北京通州区漷城西三路与漷兴西四街交叉口西北320米

**验证对象:** 福元\_中间站(二)

**温控信息:** 15.0℃~26.0℃

**验证性质:** 定期验证

**验证环境:** 低温

**验证类别:** 满载

**验证项目:**

- 温度自动监测系统测点的准确度测试
- 确定设备故障或外部供电中断的状况下库房保温性能及变化趋势
- 温度分布特性的测试与分析
- 温度监测系统配置的测点终端安装位置确认
- 本地区的高温或低温等极端外部环境条件下的温度保障能力确认

起草:

校对:

审核:

批准:

批准日期:

### 验证标准和技术要求:

依照《WHO第961号技术报告附录9: 时间和温度敏感的药品的贮运指南技术补充之温控存贮区的确认》、《药品生产质量管理规范(2019年修订)》、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》(GSP)及附录五《验证管理》、《GBT34399-2017医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范的要求》。

### 适用范围:

冷库及全部温湿度调节设施。

**北京世福宝科技有限公司**

Beijing SEVOBO Technology Co., Ltd



系统名称及版本号: 世福宝GSP/GMP冷链物流温控验证实时云系统 V1.0

公司地址: 北京市通州区马驹桥联东U谷西区11B

公司电话: 13021079718, 18610356318

公司网址: <http://www.sevobo.com>

本报告本由北京世福宝科技有限公司出具, 不得涂改、转让。北京世福宝科技有限公司拥有最终解释权。  
获报告组织必须定期接受监督审核并经审核合格方可保持报告有效。

---

# 目录

1 参与人员及培训记录.....	3
1.1 验证报告的起草、审核与批准.....	3
1.2 验证参与人员.....	3
1.3 培训记录.....	4
2 验证目的.....	6
3 验证依据.....	6
4 验证规程.....	7
5 本次验证所用主要测量设备.....	7
5.1 验证设备标准.....	7
5.2 验证设备描述.....	7
6 验证对象.....	7
6.1 对象说明.....	7
7 验证实施前准备及检查.....	8
7.1 系统条件确认.....	8
7.2 文件要求确认.....	8
7.3 验证用记录仪检验确认.....	8
7.4 环境卫生确认.....	9
7.5 人员培训确认.....	9
8 安装确认.....	9
8.1 技术资料检查.....	9
8.2 安装位置检查.....	10
8.3 设备外观检查.....	10
8.4 设备电器部分检查.....	10
9 运行确认.....	10
9.1 检查确认以下各项功能控制的稳定性和可靠性.....	11
9.2 检查确认该设备在运行时各项控制（技术）参数是否符合要求.....	11

---

10 性能确认.....	11
10.1 布点依据.....	11
10.2 测点布置.....	11
10.2.1 布点示意图.....	12
10.2.2 布点位置详表.....	12
10.3 性能确认项目.....	19
10.4 验证实施标准.....	19
11 验证过程中的异常处理.....	20
12 方案确认.....	20
13 再次验证周期.....	20

## 1 参与人员及培训记录

### 1.1 验证报告的起草、审核与批准


职责	姓名	职务	企业	签名
起草	李代万	经理	北京世福宝科技有限公司	
校对	王飞	验证专员	北京世福宝科技有限公司	
审核	金澜	验证管理部负责人	北京福元医药股份有限公司	
审核	李天	质量保证部	北京福元医药股份有限公司	
审核	张富源	储运部经理	北京福元医药股份有限公司	
审核	杨磊	设备动力部总监	北京福元医药股份有限公司	
审核	刘年永	生产总监	北京福元医药股份有限公司	
批准	贾俊	质量负责人	北京福元医药股份有限公司	

### 1.2 验证参与人员

职责	姓名	职务	企业	签名
组长	贾俊	质量负责人	北京福元医药股份有限公司	
副组长	李代万		北京世福宝科技有限公司	
副组长	****		北京福元医药股份有限公司	
组员	王飞		北京世福宝科技有限公司	
组员	王猛		北京世福宝科技有限公司	
组员	居文贤		北京世福宝科技有限公司	



## 签到表

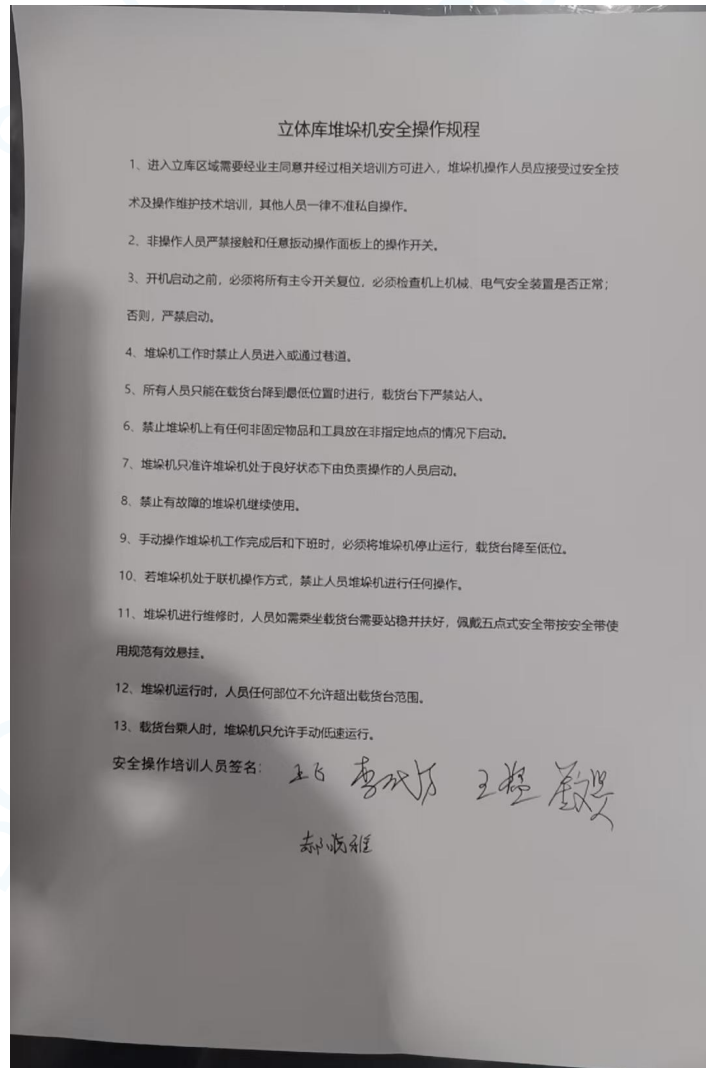

堆垛机安全操作培训

## 2 验证目的

1. 建立阴凉库温湿度验证方案，检查并确认阴凉库内温湿度计放置是否合理，证明阴凉库是否能达到规定的温度和湿度的要求。
2. 对阴凉库日常监控点的位置确认
3. 阴凉库温度分布均匀度的确认，验证该库能够达到设定的温度要求，从而满足GMP管理要求。

## 3 验证依据

1. WHO第961号技术报告附录9：《时间和温度敏感的药品的贮运指南技术补充之温控存贮区的确认》；
2. 《药品生产质量管理规范（2019年修订）》；《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》；《药品经营质量管理规范》（GSP）及附录五《验证管理

》、《GBT34399-2017医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范的要求》。

### 3. 验证实施标准:

- (1) 成品阴凉库的温度控制范围:  $<20^{\circ}\text{C}$ 。
- (2) 成品阴凉库的湿度控制范围: 45%–75%。

## 4 验证规程

1. 概述: 部分成品或者物料在贮存的过程中, 有温湿度的要求, 在成品或者物料贮存过程中, 仓库的温湿度是否符合成品或者物料贮存的要求, 需进行验证。

### 2. 验证目的要求

- (1) 检查资料 and 文件是否符合GMP管理要求。
- (2) 检查并确认成品阴凉库空调安装是否符合设计要求。
- (3) 检查并确认成品阴凉库空调运行是否符合设计要求。
- (4) 检查并确认成品阴凉库温度和湿度是否符合《WHO第961号技术报告附录9: 时间和温度敏感的药品的贮运指南技术补充之温控存贮区的确认》仓储要求。

## 5 本次验证所用主要测量设备

### 5.1 验证设备标准

1. 用于检测成品阴凉库的温湿度传感器需经过合法的校验, 并具有合格证书。
2. 验证所使用的温度传感器应当适用被验证设备的测量范围, 温度测量范围在 $-10^{\circ}\text{C}$ – $45^{\circ}\text{C}$ 之间, 温度的最大允许误差为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ; 湿度测量范围在0%–95%之间, 湿度的最大允许误差为 $\pm 3\%$ 。

### 5.2 验证设备描述

型号	品牌	温度测量范围	温度精度	湿度测量范围	湿度精度
SVB-YZ-HOST	世福宝	$-30^{\circ}\text{C}\sim 75^{\circ}\text{C}$	$+0.5^{\circ}\text{C}$ ( $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 时); $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ( $< 0^{\circ}\text{C}$ 时)	0%–95%	$\pm 3\%$
SVB-YZ-REC-1	世福宝	$-30^{\circ}\text{C}\sim 75^{\circ}\text{C}$	$+0.5^{\circ}\text{C}$ ( $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 时); $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ( $< 0^{\circ}\text{C}$ 时)	0%–95%	$\pm 3\%$
SVB-YZ-REC-02	世福宝	$-30^{\circ}\text{C}\sim 75^{\circ}\text{C}$	$+0.5^{\circ}\text{C}$ ( $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 时); $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ( $< 0^{\circ}\text{C}$ 时)	0%–95%	$\pm 3\%$
SVB-YZ-REC-03	世福宝	$-30^{\circ}\text{C}\sim 75^{\circ}\text{C}$	$+0.5^{\circ}\text{C}$ ( $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 时); $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ( $< 0^{\circ}\text{C}$ 时)	0%–95%	$\pm 3\%$

## 6 验证对象

### 6.1 对象说明

编号	福元_中间站（二）
长宽高(mm)	35m*9.75m*(21.9+4.9)m
面积(平米)	
验证范围	15.0℃~26.0℃
验证状态	定期验证

## 7 验证实施前准备及检查

### 7.1 系统条件确认

空调设备及仓库设计图情况确认表

序号	确认对象	检查标准	存放部门
1	仓库平面布置图	应有	工程设备安全部
2	仓库平面布置设计说明	应有	工程设备安全部
3	空调运行	可运行	成品阴凉库

### 7.2 文件要求确认

验证用相关文件确认表

序号	文件名称	文件编号	起草人	审核人	批准人
1	仓储管理规程				
2	仓库卫生管理规程				
3	物料储存管理规程				
4	成品入库储存发放管理规程				
5	阴凉库管理规程				
6	仓库温湿度管理规程				
7	仓库清洁标准操作规程				
8	立式空调使用标准操作规程				
9	温度记录仪使用标准操作规				

### 7.3 验证用记录仪检验确认

验证用记录仪校验情况确认表

序号	检查项目	合格要求

1	记录仪校准证书	有效期内
2	开机、记录、状态	应正常、清晰

## 7.4 环境卫生确认

阴凉库环境卫生情况确认表

序号	检查项目	检查标准
1	地面	应整洁、干净
2	门、窗、墙壁、天棚	应整洁、干净
3	设备、设施表面	应清洁、干净
4	其它	应清洁、干净

## 7.5 人员培训确认

参加验证人员培训确认表

序号	文件名称	文件编号
1	仓储管理规程	
2	仓库卫生管理规程	
3	物料储存管理规程	
4	成品入库储存发放管理规程	
5	阴凉库管理规程	
6	仓库温湿度管理规程	
7	仓库清洁标准操作规程	
8	立式空调使用标准操作规程	
9	验证用记录仪使用标准操作规程	

## 8 安装确认

### 8.1 技术资料检查

设备随机资料检查表

序号	资料名称	页数	份数	存放部门
1	设备说明书		1	工程设备安全部

2	产品合格证		1	工程设备安全部
3	装箱单		1	工程设备安全部
4	设备图纸		1	工程设备安全部
5	开箱验收记录		1	工程设备安全部
6	设备安装检查记录		1	工程设备安全部

## 8.2 安装位置检查

设备安装位置检查情况表

序号	设备名称	安装位置	安装要求
1	立式空调	成品阴凉库	使设备保持水平
2	主机的后侧离墙距离	成品阴凉库	≥0.2M
3	主机两侧离墙距离	成品阴凉库	≥0.2M

## 8.3 设备外观检查

设备外观检查情况表

序号	检查项目	合格要求
1	机身	完好
2	油漆	无脱落
3	控制面板	表面完好
4	配套管线	连接符合要求

## 8.4 设备电器部分检查

设备电器部分检查情况表

序号	检查项目	合格要求
1	电源	AC50HZ380V
2	摇控器/控制面板	灵敏
3	接地装置	应有接地线路

## 9 运行确认

在安装确认完成，以及其他相关配套条件具备后，即可进行该设备的运行确认。按照设备操作SOP对此设备进行试运行，检查其运行情况是否良好，各项指标是否达到预定的要求。

## 9.1 检查确认以下各项功能控制的稳定性和可靠性

操作控制系统功能检查记录表

序号	检查项目	要求
1	电源 符合要求	安全可靠
2	开关	控制功能方便可靠
3	控制面板或摇控器	传感灵敏度
4	开关机运行	应正常

## 9.2 检查确认该设备在运行时各项控制（技术）参数是否符合要求

设备运行参数检查记录表

序号	操作内容	操作标准
1	最低温度运行	$\geq 17^{\circ}\text{C}$
2	最高温度运行	$\leq 30^{\circ}\text{C}$
3	除湿功能运行	湿度 $>75\%$
4	自动功能运行	$17^{\circ}\text{C} \leq \text{温度} \leq 30^{\circ}\text{C}$
5	降温设定	$\leq 19^{\circ}\text{C}$


## 10 性能确认

### 10.1 布点依据

- 1、在仓库内一次性同步布点，确保各测点采集数据的同步、有效；
- 2、每个库房中均匀性布点数量不应少于9个，仓间各角及中心位置均应布置测点，每两个测点的水平间距不应大于5m，垂直间距不应超过2m。
- 3、库房每个作业出入口及风机出风口区域至少布置5个测点，库房中每组货架或建筑结构的风向死角位置至少应布置3个测点。
- 4、特殊区域应布设温度监测点，包括空调或制冷设备回风位置、温度自动监测系统测点终端安装位置、门、窗、灯等位置。
- 5、温度监测点均应布设在货位上或货物可能存放的位置。

### 10.2 测点布置

### 10.2.1 布点示意图

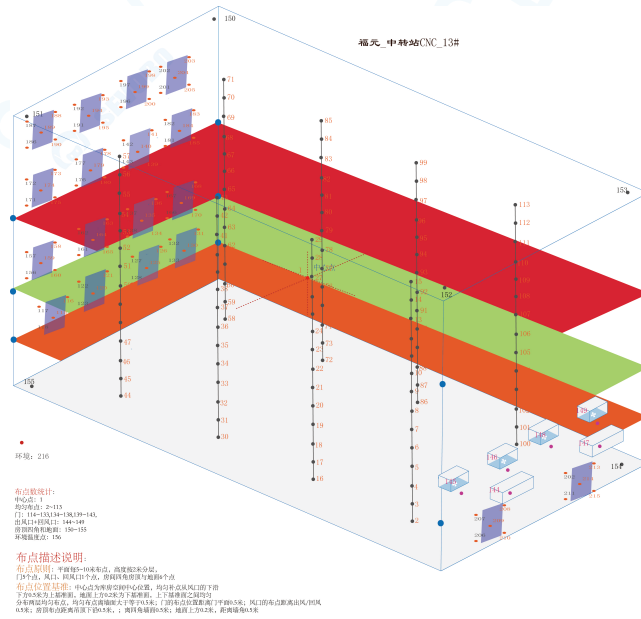

中间站（二）布点图

### 10.2.2 布点位置详表

名称	位置编码	类型
中心点1	A001	中心点
均匀布点2	A002	均匀布点
均匀布点3	A003	均匀布点
均匀布点4	A004	均匀布点
均匀布点5	A005	均匀布点
均匀布点6	A006	均匀布点
均匀布点7	A007	均匀布点
均匀布点8	A008	均匀布点
均匀布点9	A009	均匀布点
均匀布点10	A010	均匀布点
均匀布点11	A011	均匀布点
均匀布点12	A012	均匀布点
均匀布点13	A013	均匀布点
均匀布点14	A014	均匀布点
均匀布点15	A015	均匀布点

均匀布点16	A016	均匀布点
均匀布点17	A017	均匀布点
均匀布点18	A018	均匀布点
均匀布点19	A019	均匀布点
均匀布点20	A020	均匀布点
均匀布点21	A021	均匀布点
均匀布点22	A022	均匀布点
均匀布点23	A023	均匀布点
均匀布点24	A024	均匀布点
均匀布点25	A025	均匀布点
均匀布点26	A026	均匀布点
均匀布点27	A027	均匀布点
均匀布点28	A028	均匀布点
均匀布点29	A029	均匀布点
均匀布点30	A030	均匀布点
均匀布点31	A031	均匀布点
均匀布点32	A032	均匀布点
均匀布点33	A033	均匀布点
均匀布点34	A034	均匀布点
均匀布点35	A035	均匀布点
均匀布点36	A036	均匀布点
均匀布点37	A037	均匀布点
均匀布点38	A038	均匀布点
均匀布点39	A039	均匀布点
均匀布点40	A040	均匀布点
均匀布点41	A041	均匀布点
均匀布点42	A042	均匀布点
均匀布点43	A043	均匀布点
均匀布点44	A044	均匀布点
均匀布点45	A045	均匀布点
均匀布点46	A046	均匀布点
均匀布点47	A047	均匀布点

均匀布点48	A048	均匀布点
均匀布点49	A049	均匀布点
均匀布点50	A050	均匀布点
均匀布点51	A051	均匀布点
均匀布点52	A052	均匀布点
均匀布点53	A053	均匀布点
均匀布点54	A054	均匀布点
均匀布点55	A055	均匀布点
均匀布点56	A056	均匀布点
均匀布点57	A057	均匀布点
均匀布点58	A058	均匀布点
均匀布点59	A059	均匀布点
均匀布点60	A060	均匀布点
均匀布点61	A061	均匀布点
均匀布点62	A062	均匀布点
均匀布点63	A063	均匀布点
均匀布点64	A064	均匀布点
均匀布点65	A065	均匀布点
均匀布点66	A066	均匀布点
均匀布点67	A067	均匀布点
均匀布点68	A068	均匀布点
均匀布点69	A069	均匀布点
均匀布点70	A070	均匀布点
均匀布点71	A071	均匀布点
均匀布点72	A072	均匀布点
均匀布点73	A073	均匀布点
均匀布点74	A074	均匀布点
均匀布点75	A075	均匀布点
均匀布点76	A076	均匀布点
均匀布点77	A077	均匀布点
均匀布点78	A078	均匀布点
均匀布点79	A079	均匀布点

均匀布点80	A080	均匀布点
均匀布点81	A081	均匀布点
均匀布点82	A082	均匀布点
均匀布点83	A083	均匀布点
均匀布点84	A084	均匀布点
均匀布点85	A085	均匀布点
均匀布点86	A086	均匀布点
均匀布点87	A087	均匀布点
均匀布点88	A088	均匀布点
均匀布点89	A089	均匀布点
均匀布点90	A090	均匀布点
均匀布点91	A091	均匀布点
均匀布点92	A092	均匀布点
均匀布点93	A093	均匀布点
均匀布点94	A094	均匀布点
均匀布点95	A095	均匀布点
均匀布点96	A096	均匀布点
均匀布点97	A097	均匀布点
均匀布点98	A098	均匀布点
均匀布点99	A099	均匀布点
均匀布点100	A100	均匀布点
均匀布点101	A101	均匀布点
均匀布点102	A102	均匀布点
均匀布点103	A103	均匀布点
均匀布点104	A104	均匀布点
均匀布点105	A105	均匀布点
均匀布点106	A106	均匀布点
均匀布点107	A107	均匀布点
均匀布点108	A108	均匀布点
均匀布点109	A109	均匀布点
均匀布点110	A110	均匀布点
均匀布点111	A111	均匀布点

均匀布点112	A112	均匀布点
均匀布点113	A113	均匀布点
门114	A114	门
门115	A115	门
门116	A116	门
门117	A117	门
门118	A118	门
门119	A119	门
门120	A120	门
门121	A121	门
门122	A122	门
门123	A123	门
门124	A124	门
门125	A125	门
门126	A126	门
门127	A127	门
门128	A128	门
门129	A129	门
门130	A130	门
门131	A131	门
门132	A132	门
门133	A133	门
门134	A134	门
门135	A135	门
门136	A136	门
门137	A137	门
门138	A138	门
门139	A139	门
门140	A140	门
门141	A141	门
门142	A142	门
门143	A143	门

回风口144	A144	风机
出风口145	A145	风机
出风口146	A146	风机
回风口147	A147	风机
出风口148	A148	风机
出风口149	A149	风机
房顶150	A150	风向死角
房顶151	A151	风向死角
房顶152	A152	风向死角
房顶153	A153	风向死角
地面154	A154	风向死角
地面155	A155	风向死角
门156	A156	门
门157	A157	门
门158	A158	门
门159	A159	门
门160	A160	门
门161	A161	门
门162	A162	门
门163	A163	门
门164	A164	门
门165	A165	门
门166	A166	门
门167	A167	门
门168	A168	门
门169	A169	门
门170	A170	门
门171	A171	门
门172	A172	门
门173	A173	门
门174	A174	门
门175	A175	门

门176	A176	门
门177	A177	门
门178	A178	门
门179	A179	门
门180	A180	门
门181	A181	门
门182	A182	门
门183	A183	门
门184	A184	门
门185	A185	门
门186	A186	门
门187	A187	门
门188	A188	门
门189	A189	门
门190	A190	门
门191	A191	门
门192	A192	门
门193	A193	门
门194	A194	门
门195	A195	门
门196	A196	门
门197	A197	门
门198	A198	门
门199	A199	门
门200	A200	门
门201	A201	门
门202	A202	门
门203	A203	门
门204	A204	门
门205	A205	门
门206	A206	门
门207	A207	门

门208	A208	门
门209	A209	门
门210	A210	门
门211	A211	门
门212	A212	门
门213	A213	门
门214	A214	门
门215	A215	门
环境外温216	A216	环境外温

### 10.3 性能确认项目

序号	验证项目
1	温度分布特性的测试与分析
2	温度自动监测系统测点的准确度测试
3	温度监测系统配置的测点终端安装位置确认
4	确定设备故障或外部供电中断的状况下库房保温性能及变化趋势
5	本地区的高温或低温等极端外部环境条件下的温度保障能力确认

### 10.4 验证实施标准

序号	操作内容	操作要求	操作标准
1	安装验证采集记录仪	如果不能同步有效，更换设备。	按方案实际安装数据采集点，确保各测点采集数据的同步、有效。
2	确认验证对象各项参数	依据验证方案确定验证对象各项参数。	确认验证对象各项参数。
3	偏差调整	如果存在偏差依据偏差值重新调整制冷机控制限值或校准温控器，偏差纠正后继续采集温度。对验证过程中出现的偏差情况要如实记录并记录调整过程及调整后结果。	在库内温度稳定后，检查各采集测点温度是否稳定在验证规定温度内。

4	验证数据采集	1、环境温度。2、测点终端位置数据与均匀分布点数据相一致，差值不超过+1.0℃。3、测点终端安装位置应在冷点、热点及均衡点所在区域如果不在，需调整至冷点、热点。4、在当前设定参数下，温度稳定在验证规定温度内，如果不在，需重新设定参数，重新验证。5、采集点温度稳定在验证规定温度内。如验证过程中出现采集点位置改变等原因影响数据连续有效采集的情况需在采集点位置恢复后重新验证。	到达预定温度后，关闭库门，库内各采集测点温度稳定在验证规定温内开始采集验证数据。数据有效持续稳定采集时间不得少于48小时，（开门及断电测试时间除外）。包括以下验证内容:1、本地区高温或低温等极端外部环境条件下的运行情况;2、温度自动监测系统测点终端的准确度确认:3、监测系统配置的测点终端安装位置确认:4、温控设施运行参数及使用状况测试;5、车厢内温度分布特性的测试与分析。
5	断电验证	计算断电时库内升温最快的点位速率得出最长断电保温时间	断电验证在温控器显示值为温度低点风机停机时进行断电测试。关闭风机，保持库门关闭状态。若执行多次断电验证，开启风机后实时验证数据达到断电实施的预设温度值再实施下一次断电作业。
7	现场拍照	图片清晰。	拍摄验证过程中图片。

## 11 验证过程中的异常处理

序号	异常情况	处理标准
1	验证过程中异常情况的处理	如验证过程中出现制冷设备故障，验证采集点位置变化等原因影响数据连续有效采集的情况下，需在设备故障修复后重新验证。
2	验证的偏差处理	验证过程中如存在温度控制器设定值不合理等偏差需调整后重新开始验证。

## 12 方案确认

经验证小组审批，验证方案符合标准要求，批准按方案实施验证，特此声明。

## 13 再次验证周期

1. 在一般正常使用情况下，每五年再验证一次。
2. 遇任何重大变更，需要再次验证，以证明各种重大变更不会对现有使用效果产生影响；

- 
- (1) 设备移动安装地点或位置
  - (2) 重要配套设备变更或进行重大维修项目
  - (3) 设备性能参数应用超出本验证范围

负责人 \_\_\_\_\_
