



GMP验证报告

GMP VERIFICATION REPORT

验证企业: 北京福元医药股份有限公司

验证地址: 北京通州区漷城西三路与漷兴西四街交叉口西北320米

验证对象: 福元_零头库_22E018

温控信息: 10.0℃~25.0℃

验证性质: 定期验证

验证环境: 高温

验证类别: 满载

验证项目: 温度自动监测系统测点的准确度测试
确定设备故障或外部供电中断的状况下库房保温性能及变化趋势
温控设施设备运行参数及使用状况测试-参数测试
温度分布特性的测试与分析
温度监测系统配置的测点终端安装位置确认
开门作业对库房温度分布的影响
本地区的高温或低温等极端外部环境条件下的温度保障能力确认

验证实施日期:

签发:

验证标准和技术要求:

依照《WHO第961号技术报告附录9: 时间和温度敏感的药品的贮运指南技术补充之温控存贮区的确认》、《药品生产质量管理规范(2019年修订)》、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》(GSP)及附录五《验证管理》、《GBT34399-2017医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范的要求》。

适用范围:

冷库及全部温湿度调节设施。

签发日期:

北京世福宝科技有限公司

Beijing SEVOBO Technology Co., Ltd



系统名称及版本号: 世福宝GSP/GMP冷链物流温控验证实时云系统 V1.0

公司地址: 北京市通州区马驹桥联东U谷西区11B

公司电话: 13021079718, 18610356318

公司网址: <http://www.sevobo.com>

本报告本由北京世福宝科技有限公司出具, 不得涂改、转让。北京世福宝科技有限公司拥有最终解释权。
获报告组织必须定期接受监督审核并经审核合格方可保持报告有效。

目录

1 参与人员及培训记录.....	3
1.1 验证报告的起草、审核与批准.....	3
1.2 验证参与人员.....	3
1.3 培训记录.....	4
2 验证目的.....	5
3 验证依据.....	5
4 验证规程.....	6
5 本次验证所用主要测量设备.....	6
5.1 验证设备标准.....	6
5.2 验证设备描述.....	6
5.3 验证设备清单.....	6
6 验证对象.....	11
6.1 对象说明.....	11
7 验证实施前准备及检查.....	11
7.1 系统条件确认.....	11
7.2 文件要求确认.....	11
7.3 验证用记录仪检验确认.....	12
7.4 环境卫生确认.....	12
7.5 人员培训确认.....	13
8 安装确认.....	13
8.1 技术资料检查.....	14
8.2 安装位置检查.....	14
8.3 设备外观检查.....	14
8.4 设备电器部分检查.....	15
9 运行确认.....	15
9.1 检查确认以下各项功能控制的稳定性和可靠性.....	15

9.2 检查确认该设备在运行时各项控制（技术）参数是否符合要求.....	16
10 性能确认.....	16
10.1 布点依据.....	16
10.2 测点布置.....	16
10.2.1 布点示意图.....	17
10.2.2 布点位置详表.....	17
10.2.3 现场照片.....	19
11 验证项目实施.....	19
11.1 温度分布特性测试.....	19
11.2 湿度分布特性.....	24
11.3 温控设施设备运行参数及使用状况测试.....	27
11.4 温度自动监测设备安装位置确认.....	28
11.5 监测点位安装位置精确度.....	29
11.6 开关门验证.....	31
11.7 设备故障或外部供电中断的状况下保温性能及变化趋势.....	33
11.8 本地区的高温或低温等极端外部环境条件下保温效果评估.....	35
12 偏差处理.....	36
13 验证结论.....	36
14 报告确认.....	37
15 再次验证周期.....	38

1 参与人员及培训记录

1.1 验证报告的起草、审核与批准

职责	姓名	职务	企业	签名
起草	李代万	经理	北京世福宝科技有限公司	
校对	王飞	验证专员	北京世福宝科技有限公司	
审核	金澜	验证管理部负责人	北京福元医药股份有限公司	
审核	李天	质量保证部	北京福元医药股份有限公司	
审核	张富源	储运部经理	北京福元医药股份有限公司	
审核	杨磊	设备动力部总监	北京福元医药股份有限公司	
审核	刘年永	生产总监	北京福元医药股份有限公司	
批准	贾俊	质量负责人	北京福元医药股份有限公司	

1.2 验证参与人员

职责	姓名	职务	企业	签名
组长	贾俊	质量负责人	北京福元医药股份有限公司	
副组长	李代万		北京世福宝科技有限公司	
副组长	****		北京福元医药股份有限公司	
组员	王飞		北京世福宝科技有限公司	
组员	王猛		北京世福宝科技有限公司	
组员	居文贤		北京世福宝科技有限公司	

组员	郝晓雅		北京世福宝科技 有限公司
----	-----	--	-----------------

1.3 培训记录



图：验证培训

确认》；

2. 《药品生产质量管理规范（2019年修订）》；《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》；《药品经营质量管理规范》（GSP）及附录五《验证管理》、《GBT34399-2017医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范的要求》。

3. 验证实施标准：

- (1) 成品阴凉库的温度控制范围：<20℃。
- (2) 成品阴凉库的湿度控制范围：45%-75%。

4 验证规程

1. 概述：部分成品或者物料在贮存的过程中，有温湿度的要求，在成品或者物料贮存过程中，仓库的温湿度是否符合成品或者物料贮存的要求，需进行验证。

2. 验证目的要求

- (1) 检查资料 and 文件是否符合GMP管理要求。
- (2) 检查并确认成品阴凉库空调安装是否符合设计要求。
- (3) 检查并确认成品阴凉库空调运行是否符合设计要求。
- (4) 检查并确认成品阴凉库温度和湿度是否符合《WHO第961号技术报告附录9：时间和温度敏感的药品的贮运指南技术补充之温控存贮区的确认》仓储要求。

5 本次验证所用主要测量设备

5.1 验证设备标准

- 1. 用于检测成品阴凉库的温湿度传感器需经过合法的校验，并具有合格证书。
- 2. 验证所使用的温度传感器应当适用被验证设备的测量范围，温度测量范围在-10℃-45℃之间，温度的最大允许误差为±0.5℃；湿度测量范围在0%-95%之间，湿度的最大允许误差为±3%。

5.2 验证设备描述

型号	品牌	温度测量范围	温度精度	湿度测量范围	湿度精度
SVB-YZ-HOST	世福宝	-30° C~75° C	+0.5° C (≥0° C 时)； ±1° C (<0° C 时)	0%-95%	±3%
SVB-YZ-REC-1	世福宝	-30° C~75° C	+0.5° C (≥0° C 时)； ±1° C (<0° C 时)	0%-95%	±3%
SVB-YZ-REC-02	世福宝	-30° C~75° C	+0.5° C (≥0° C 时)； ±1° C (<0° C 时)	0%-95%	±3%
SVB-YZ-REC-03	世福宝	-30° C~75° C	+0.5° C (≥0° C 时)； ±1° C (<0° C 时)	0%-95%	±3%

5.3 验证设备清单

型号	设备号	校准单位	校准证书	有效期	校准结果
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60280198 03	济南市计 量检定测 试院	24001165 206	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60881788 03	济南市计 量检定测 试院	24001165 262	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61483238 03	济南市计 量检定测 试院	24001166 822	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60882418 03	济南市计 量检定测 试院	24001165 184	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61484208 03	济南市计 量检定测 试院	24001166 848	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61480638 03	济南市计 量检定测 试院	24001166 750	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60280328 03	济南市计 量检定测 试院	24001165 211	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61483848 03	济南市计 量检定测 试院	24001166 840	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61485468 03	济南市计 量检定测 试院	24001166 869	2025-12-04	合格

SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60280118 03	济南市计 量检定测 试院	24001165 204	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61480738 03	济南市计 量检定测 试院	24001166 752	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61481078 03	济南市计 量检定测 试院	24001166 758	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60882068 03	济南市计 量检定测 试院	24001165 274	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60880498 03	济南市计 量检定测 试院	24001165 234	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60882508 03	济南市计 量检定测 试院	24001165 189	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60882598 03	济南市计 量检定测 试院	24001165 192	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61481848 03	济南市计 量检定测 试院	24001166 788	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61485508 03	济南市计 量检定测 试院	24001166 870	2025-12-04	合格

SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80880128 03	济南市计 量检定测 试院	24001164 977	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80280158 03	济南市计 量检定测 试院	24001164 940	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80880498 03	济南市计 量检定测 试院	24001165 014	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80280308 03	济南市计 量检定测 试院	24001164 955	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80280078 03	济南市计 量检定测 试院	24001164 932	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80280168 03	济南市计 量检定测 试院	24001164 941	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80880108 03	济南市计 量检定测 试院	24001164 975	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80880368 03	济南市计 量检定测 试院	24001165 001	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80280278 03	济南市计 量检定测 试院	24001164 952	2025-12-04	合格

SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80280038 03	济南市计 量检定测 试院	24001164 928	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61480468 03	济南市计 量检定测 试院	24001166 747	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60280228 03	济南市计 量检定测 试院	24001165 207	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61481428 03	济南市计 量检定测 试院	24001166 775	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61486068 03	济南市计 量检定测 试院	24001166 885	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60880478 03	济南市计 量检定测 试院	24001165 232	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61480978 03	济南市计 量检定测 试院	24001166 756	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60881858 03	济南市计 量检定测 试院	24001165 265	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80280368 03	济南市计 量检定测 试院	24001164 961	2025-12-04	合格

SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61486548 03	济南市计 量检定测 试院	24001166 895	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61480798 03	济南市计 量检定测 试院	24001166 753	2025-12-04	合格

6 验证对象

6.1 对象说明

编号	福元_零头库_22E018
长宽高(mm)	8m*3.76m*4.5m
面积(平米)	
验证范围	10.0℃~25.0℃
验证状态	定期验证

7 验证实施前准备及检查

7.1 系统条件确认

空调设备及仓库设计图情况确认表

序号	确认对象	检查标准	存放部门	确认结论
1	仓库平面布置图	应有	工程设备安全部	
2	仓库平面布置设计说明	应有	工程设备安全部	
3	空调运行	可运行	成品阴凉库	

检查人	
复核人	
确认结果	
确认人/日期	

7.2 文件要求确认

验证用相关文件确认表

序号	文件名称	文件编号	起草人	审核人	批准人	执行日
1	仓储管理规程					
2	仓库卫生管理规程					
3	物料储存管理规程					
4	成品入库储存发放管理规程					
5	阴凉库管理规程					
6	仓库温湿度管理规程					
7	仓库清洁标准操作规程					
8	立式空调使用标准操作规程					
9	温度记录仪使用标准操作规程					

检查人	
复核人	
确认结果	
确认人/日期	

7.3 验证用记录仪检验确认

验证用记录仪校验情况确认表

序号	检查项目	合格要求	检查结论
1	记录仪校准证书	有效期内	
2	开机、记录、状态	应正常、清晰	

检查人	
复核人	
确认结果	
确认人/日期	

7.4 环境卫生确认

阴凉库环境卫生情况确认表

序号	检查项目	检查标准	确认结果
1	地面	应整洁、干净	
2	门、窗、墙壁、天棚	应整洁、干净	
3	设备、设施表面	应清洁、干净	
4	其它	应清洁、干净	

检查人	
复核人	
确认结果	
确认人/日期	

7.5 人员培训确认

参加验证人员培训确认表

序号	文件名称	文件编号	培训日期
1	仓储管理规程		
2	仓库卫生管理规程		
3	物料储存管理规程		
4	成品入库储存发放管理规程		
5	阴凉库管理规程		
6	仓库温湿度管理规程		
7	仓库清洁标准操作规程		
8	立式空调使用标准操作规程		
9	验证用记录仪使用标准操作规程		

检查人	
复核人	
确认结果	
确认人/日期	

8 安装确认

8.1 技术资料检查

设备随机资料检查表

序号	资料名称	页数	份数	存放部门	检查结论
1	设备说明书		1	工程设备安全部	
2	产品合格证		1	工程设备安全部	
3	装箱单		1	工程设备安全部	
4	设备图纸		1	工程设备安全部	
5	开箱验收记录		1	工程设备安全部	
6	设备安装检查记录		1	工程设备安全部	

检查人	
复核人	
评定结果	
评定人/日期	

8.2 安装位置检查

设备安装位置检查情况表

序号	设备名称	安装位置	安装要求	检查结论
1	立式空调	成品阴凉库	使设备保持水平	
2	主机的后侧离墙距离	成品阴凉库	$\geq 0.2M$	
3	主机两侧离墙距离	成品阴凉库	$\geq 0.2M$	

检查人	
复核人	
评定结果	
评定人/日期	

8.3 设备外观检查

设备外观检查情况表

序号	检查项目	合格要求	检查结论
----	------	------	------

1	机身	完好	
2	油漆	无脱落	
3	控制面板	表面完好	
4	配套管线	连接符合要求	

检查人	
复核人	
评定结果	
评定人/日期	

8.4 设备电器部分检查

设备电器部分检查情况表

序号	检查项目	合格要求	检查结论
1	电源	AC50HZ380V	
2	摇控器/控制面板	灵敏	
3	接地装置	应有接地线路	

检查人	
复核人	
评定结果	
评定人/日期	

9 运行确认

在安装确认完成，以及其他相关配套条件具备后，即可进行该设备的运行确认。按照设备操作SOP对此设备进行试运行，检查其运行情况是否良好，各项指标是否达到预定的要求。

9.1 检查确认以下各项功能控制的稳定性和可靠性

操作控制系统功能检查记录表

序号	检查项目	要求	结果
1	电源 符合要求	安全可靠	合格
2	开关	控制功能方便可靠	合格

3	控制面板或摇控器	传感灵敏度	合格
4	开关机运行	应正常	合格

检查人	
复核人	
评定结果	
评定人/日期	

9.2 检查确认该设备在运行时各项控制（技术）参数是否符合要求

设备运行参数检查记录表

序号	操作内容	操作标准	结果
1	最低温度运行	$\geq 17^{\circ}\text{C}$	合格
2	最高温度运行	$\leq 30^{\circ}\text{C}$	合格
3	除湿功能运行	湿度 $>75\%$	合格
4	自动功能运行	$17^{\circ}\text{C} \leq \text{温度} \leq 30^{\circ}\text{C}$	合格
5	降温设定	$\leq 19^{\circ}\text{C}$	合格

检查人	
复核人	
评定结果	
评定人/日期	


10 性能确认

10.1 布点依据

- 1、在仓库内一次性同步布点，确保各测点采集数据的同步、有效；
- 2、每个库房中均匀性布点数量不应少于9个，仓间各角及中心位置均应布置测点，每两个测点的水平间距不应大于5m，垂直间距不应超过2m。
- 3、库房每个作业出入口及风机出风口区域至少布置5个测点，库房中每组货架或建筑结构的风向死角位置至少应布置3个测点。
- 4、特殊区域应布设温度监测点，包括空调或制冷设备回风位置、温度自动监测系统测点终端安装位置、门、窗、灯等位置。
- 5、温度监测点均应布设在货位上或货物可能存放的位置。

10.2 测点布置

10.2.1 布点示意图

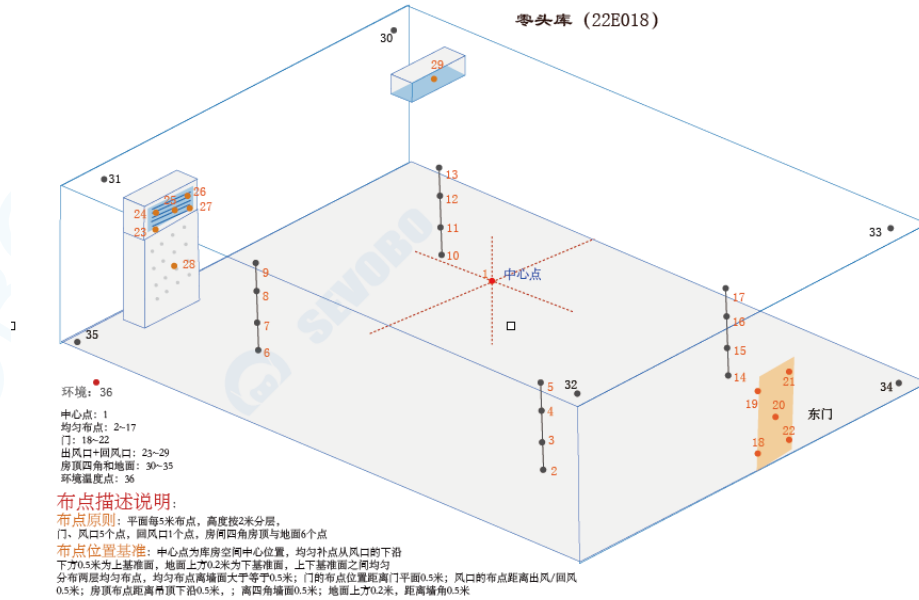

布点示意图

10.2.2 布点位置详表

名称	位置编码	类型	设备型号	设备编号
中心点1	A01	中心点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306028019803
均匀布点2	A02	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088178803
均匀布点3	A03	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148323803
均匀布点4	A04	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088241803
均匀布点5	A05	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148420803
均匀布点6	A06	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148063803
均匀布点7	A07	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306028032803

均匀布点8	A08	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148384803
均匀布点9	A09	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148546803
均匀布点10	A10	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306028011803
均匀布点11	A11	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148073803
均匀布点12	A12	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148107803
均匀布点13	A13	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088206803
均匀布点14	A14	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088049803
均匀布点15	A15	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088250803
均匀布点16	A16	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088259803
均匀布点17	A17	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148184803
门18	A18	门	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148550803
门19	A19	门	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408088012803
门20	A20	门	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408028015803
门21	A21	门	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408088049803
门22	A22	门	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408028030803
出风口23	A23	风机	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408028007803
出风口24	A24	风机	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408028016803


出风口25	A25	风机	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408088010803
出风口26	A26	风机	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408088036803
出风口27	A27	风机	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408028027803
回风口28	A28	风机	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408028003803
回风口29	A29	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148046803
房顶30	A30	风向死角	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306028022803
房顶31	A31	风向死角	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148142803
房顶32	A32	风向死角	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148606803
房顶33	A33	风向死角	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088047803
地面34	A34	风向死角	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148097803
地面35	A35	风向死角	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088185803
环境外温36	A36	环境外温	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408028036803
监测位置37	A37	监测位置/均匀 布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148654803
监测位置38	A38	监测位置/均匀 布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148079803

10.2.3 现场照片

11 验证项目实施

11.1 温度分布特性测试

11.1.1 温度分布特性

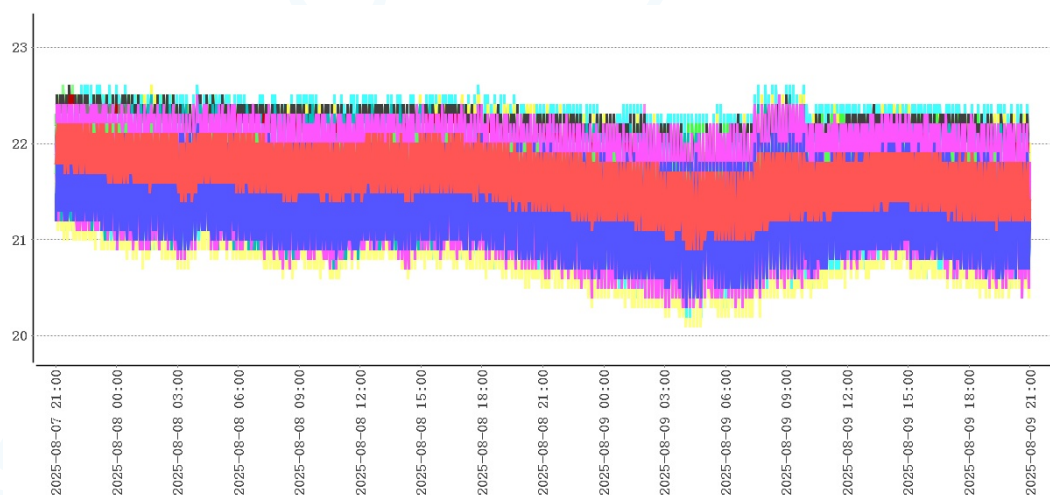

—A01 —A02 —A03 —A04 —A05 —A06 —A07 —A08 —A09 —A10 —A11 —A12 —A13 —A14 —A15 —A16 —A17 —A18 —A19 —A20
—A21 —A22 —A23 —A24 —A25 —A26 —A27 —A28 —A29 —A30 —A31 —A32 —A33 —A34 —A35 —A37 —A38


点位类型	测点	最大值	最小值	平均值
中心点	A01	22.2	20.9	21.6
均匀布点	A02	22.2	20.3	21.4
	A03	22.2	20.8	21.6
	A04	22.1	20.6	21.4
	A05	22.5	20.3	21.4
	A06	22.4	20.7	21.6
	A07	22.4	20.8	21.6
	A08	22.4	21.1	21.8
	A09	22.5	21.0	21.8
	A10	22.2	20.9	21.6
	A11	22.3	21.1	21.8
	A12	22.2	21.0	21.6
	A13	22.4	21.0	21.7
	A14	22.5	20.4	21.5
	A15	22.6	20.6	21.7
	A16	22.4	20.7	21.6
	A17	22.3	20.9	21.6
	出入口	A18	22.5	20.4
A19		22.6	20.7	21.7
A20		22.5	20.6	21.6

	A21	22.6	20.2	21.5
	A22	22.5	20.5	21.5
风机	A23	22.3	21.1	21.8
	A24	22.3	21.1	21.7
	A25	22.3	21.0	21.7
	A26	22.2	21.1	21.7
	A27	22.3	21.0	21.7
	A28	22.2	20.8	21.6
	A29	22.1	20.9	21.5
风向死角	A30	22.3	20.8	21.6
	A31	22.6	20.9	21.9
	A32	22.5	20.1	21.3
	A33	22.6	20.3	21.6
	A34	22.5	20.2	21.4
	A35	22.3	20.6	21.6
环境外温	A36	33.8	21.2	26.4
监测位置/均匀布点	A37	22.5	21.2	21.9
	A38	22.5	21.6	22.0

在库房空调或制冷系统温度控制参数符合设定要求、库房温度符合设定范围后，数据有效持续采集时间为48小时0分钟，在环境温度处于21.2℃~33.8℃情况下，库内各测点温度在20.1℃(A32)~22.6℃(A15, A19, A21, A31, A33)之间，未超出温控范围10.0℃~25.0℃。根据《GBT34399-2017医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范》附录A计算方法，温度偏差 $\Delta t_d = t_d - t_o = -0.6^\circ\text{C}$ 、波动度 $\Delta t_f = \pm (t_{\text{max}} - t_{\text{min}}) / 2 = 0.7^\circ\text{C}$ 、均匀度 $\Delta t_u = \Sigma (t_{\text{imax}} - t_{\text{imin}}) / n = 0.9^\circ\text{C}$ ，可知偏差、均匀度、波动度各项数值不高于 $\pm 3^\circ\text{C}$ ，符合国标要求。

11.1.2 风机


11.1.2.1 风机01

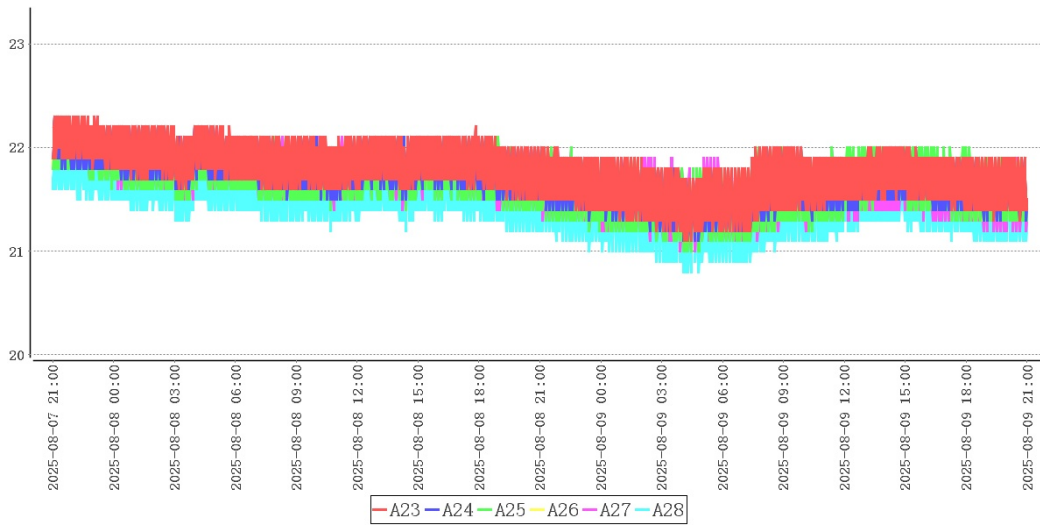

测点	最大值	最小值	平均值
A23	22.3	21.1	21.8
A24	22.3	21.1	21.7
A25	22.3	21.0	21.7
A26	22.2	21.1	21.7
A27	22.3	21.0	21.7
A28	22.2	20.8	21.6

检测项目	规范要求	检测结果	结论
风机01附近温度均匀性	全部测点温度范围 (10.0~25.0)℃	20.8~22.3℃	合格


11.1.2.2 风机00

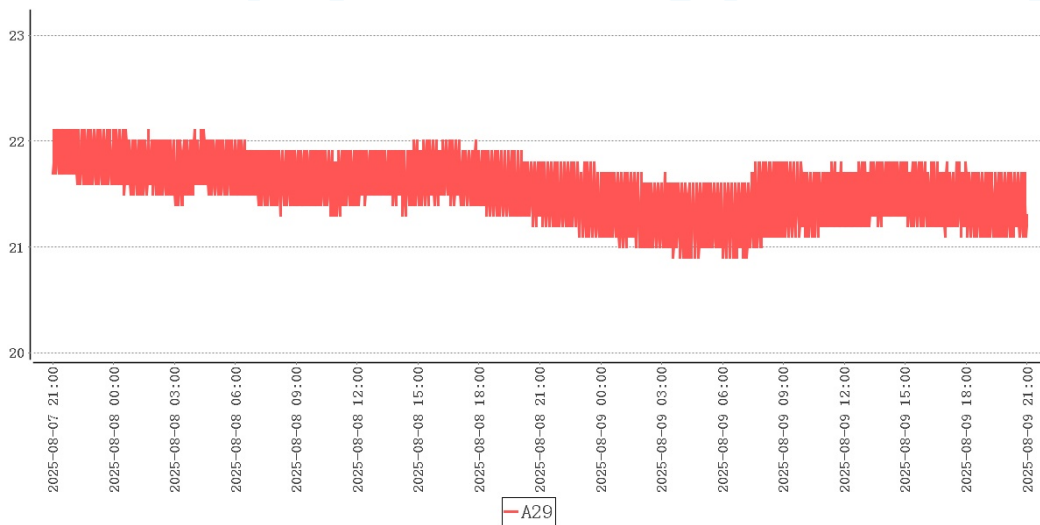

测点	最大值	最小值	平均值
A29	22.1	20.9	21.5

检测项目	规范要求	检测结果	结论
风机00附近温度均匀性	全部测点温度范围 (10.0~25.0)℃	20.9~22.1℃	合格


11.1.3 出入口

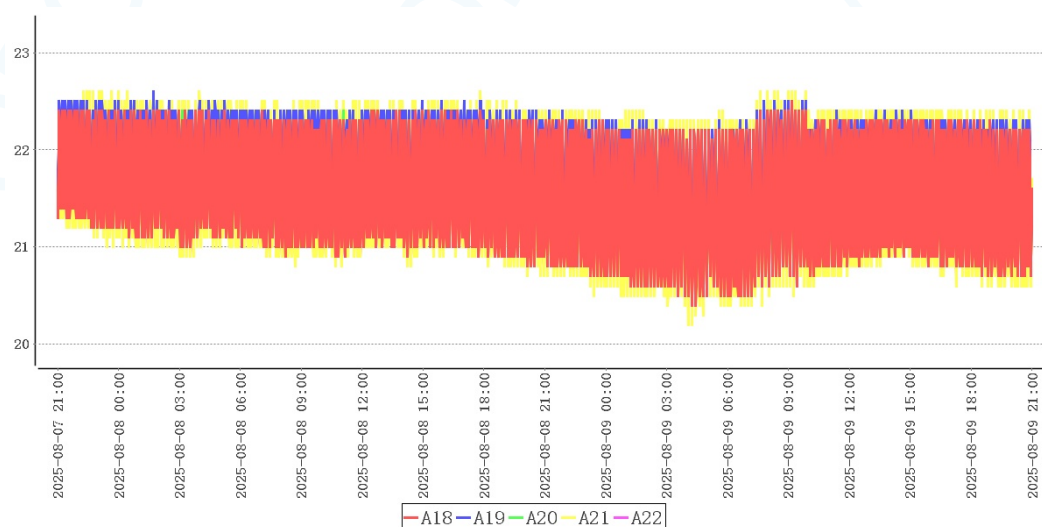

测点	最大值	最小值	平均值
A18	22.5	20.4	21.5
A19	22.6	20.7	21.7
A20	22.5	20.6	21.6
A21	22.6	20.2	21.5
A22	22.5	20.5	21.5

检测项目	规范要求	检测结果	结论
门01附近温度均匀性	全部测点温度范围 (10.0~25.0)℃	20.2~22.6℃	合格

11.1.4 风向死角

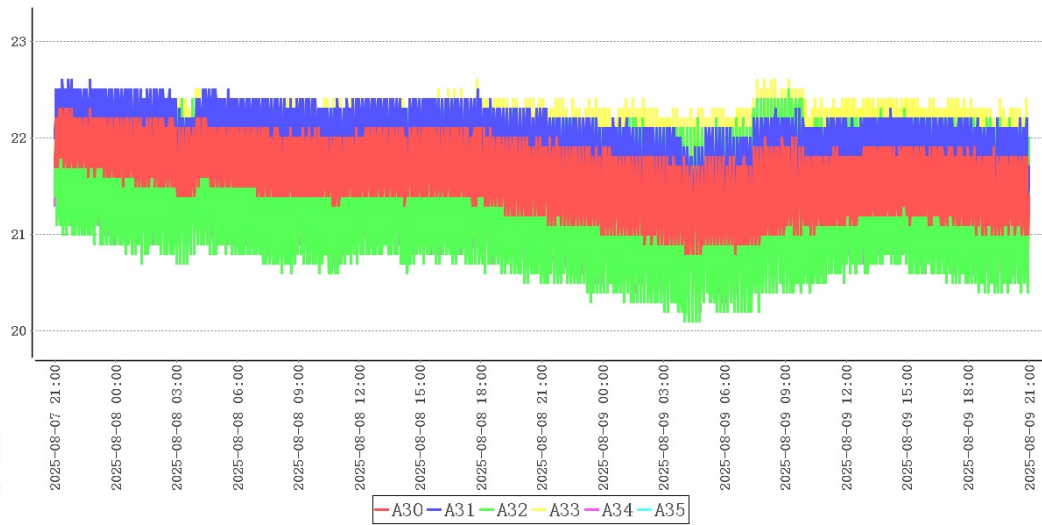

测点	最大值	最小值	平均值
A30	22.3	20.8	21.6
A31	22.6	20.9	21.9
A32	22.5	20.1	21.3
A33	22.6	20.3	21.6
A34	22.5	20.2	21.4
A35	22.3	20.6	21.6

检测项目	规范要求	检测结果	结论
风向死角附近温度均匀性	全部测点温度范围 (10.0~25.0)℃	20.1~22.6℃	合格


11.1.5 适宜存放的安全位置及区域

根据以上分析，该冷库中除个别温度易超标区域不适合存放药品外，其他区域皆可放置。

不适合存放药品的区域有：风机出风口下沿正前方以上整体空间范围内，门口1米空间范围内，风向死角范围内。

11.2 湿度分布特性

11.2.1 库内各点相对湿度

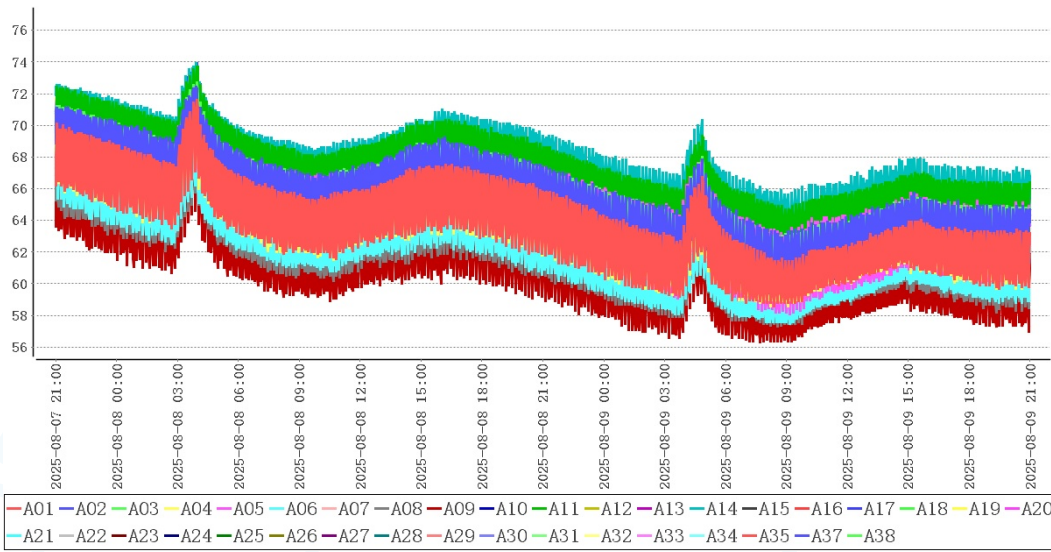


点位类型	测点	最大值	最小值	平均值
中心点	A01	71.6	58.6	63.7
均匀布点	A02	72.4	59.3	64.6
	A03	72.7	60.3	65.1
	A04	71.7	58.6	63.7
	A05	71.9	58.1	64.2
	A06	71.5	57.5	63.0
	A07	71.9	58.6	63.7
	A08	70.4	57.3	62.4
	A09	70.1	56.3	61.4
	A10	71.4	58.6	63.8
	A11	73.7	62.2	66.8
	A12	71.5	59.2	64.1
	A13	70.1	58.1	62.7
	A14	73.9	60.4	66.3
	A15	71.2	58.0	63.3
	A16	72.5	59.6	64.5
	A17	73.9	61.6	66.4
	出入口	A18	71.9	58.3
A19		71.9	59.6	64.5
A20		72.0	58.2	63.7

	A21	71.3	57.3	63.4
	A22	70.7	56.7	62.7
风机	A23	70.6	57.3	62.7
	A24	70.4	57.4	62.5
	A25	70.8	58.2	63.1
	A26	72.2	59.9	64.9
	A27	70.7	57.6	62.7
	A28	71.1	58.0	63.1
	A29	70.8	58.3	63.2
风向死角	A30	70.6	58.5	63.1
	A31	70.1	57.0	61.7
	A32	72.9	58.3	64.7
	A33	72.0	58.4	64.1
	A34	72.1	57.8	64.2
	A35	71.4	57.7	63.1
环境外温	A36	98.9	41.2	78.7
监测位置/均匀布点	A37	70.0	57.7	62.6
	A38	69.1	57.8	62.4

从各监测点相对湿度数据分布图可以看出：库内各点湿度处于56.3%(A09)~73.9%(A14)之间变化，湿度平均值处于61.4%(A09)~66.8%(A11)之间，符合相对湿度10.0%~75.0%要求。


11.2.2 库内各点平均湿度

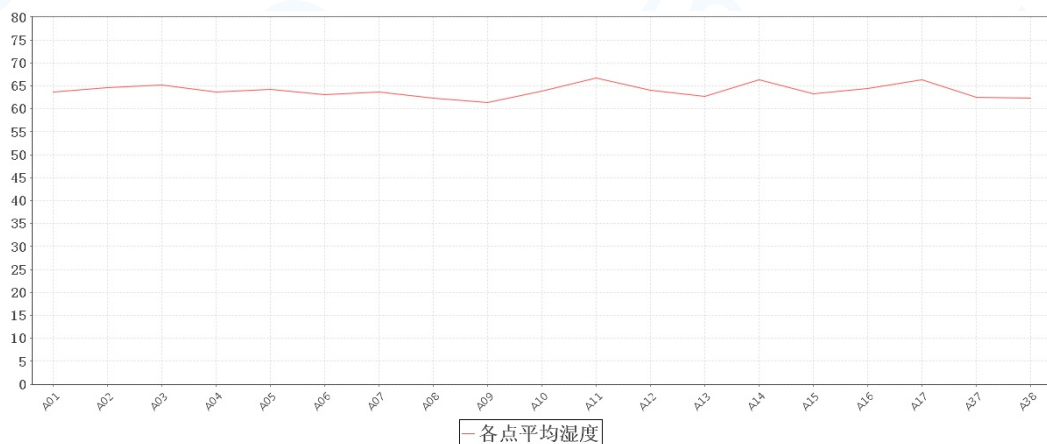

从各监测点相对湿度数据分布图可以看出：库内各点相对湿度平均值差别较大，建议增加除湿设备进行除湿。

11.3 温控设施设备运行参数及使用状况测试

风机名称	设定启动	设定停止	检测启动	检测停止	结果
风机01					
风机00					

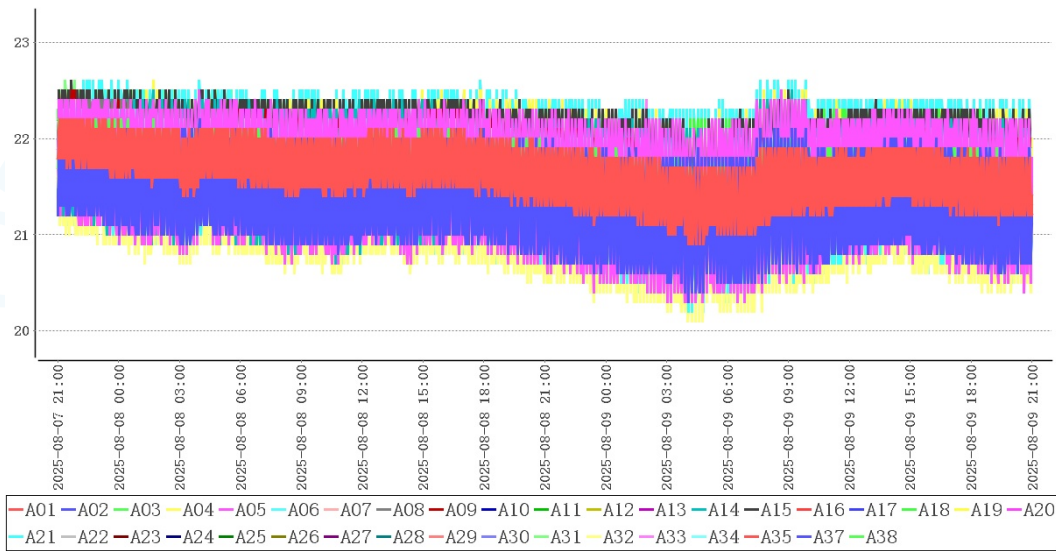


测点	最大值	最小值	平均值
A01	22.2	20.9	21.6
A02	22.2	20.3	21.4
A03	22.2	20.8	21.6
A04	22.1	20.6	21.4
A05	22.5	20.3	21.4
A06	22.4	20.7	21.6
A07	22.4	20.8	21.6
A08	22.4	21.1	21.8
A09	22.5	21.0	21.8
A10	22.2	20.9	21.6
A11	22.3	21.1	21.8
A12	22.2	21.0	21.6
A13	22.4	21.0	21.7
A14	22.5	20.4	21.5
A15	22.6	20.6	21.7

A16	22.4	20.7	21.6
A17	22.3	20.9	21.6
A18	22.5	20.4	21.5
A19	22.6	20.7	21.7
A20	22.5	20.6	21.6
A21	22.6	20.2	21.5
A22	22.5	20.5	21.5
A23	22.3	21.1	21.8
A24	22.3	21.1	21.7
A25	22.3	21.0	21.7
A26	22.2	21.1	21.7
A27	22.3	21.0	21.7
A28	22.2	20.8	21.6
A29	22.1	20.9	21.5
A30	22.3	20.8	21.6
A31	22.6	20.9	21.9
A32	22.5	20.1	21.3
A33	22.6	20.3	21.6
A34	22.5	20.2	21.4
A35	22.3	20.6	21.6
A37	22.5	21.2	21.9
A38	22.5	21.6	22.0

在当前设置的工作条件下，库内温度在20.1℃~22.6℃之间，符合10.0℃~25.0℃验证标准。

11.4 温度自动监测设备安装位置确认

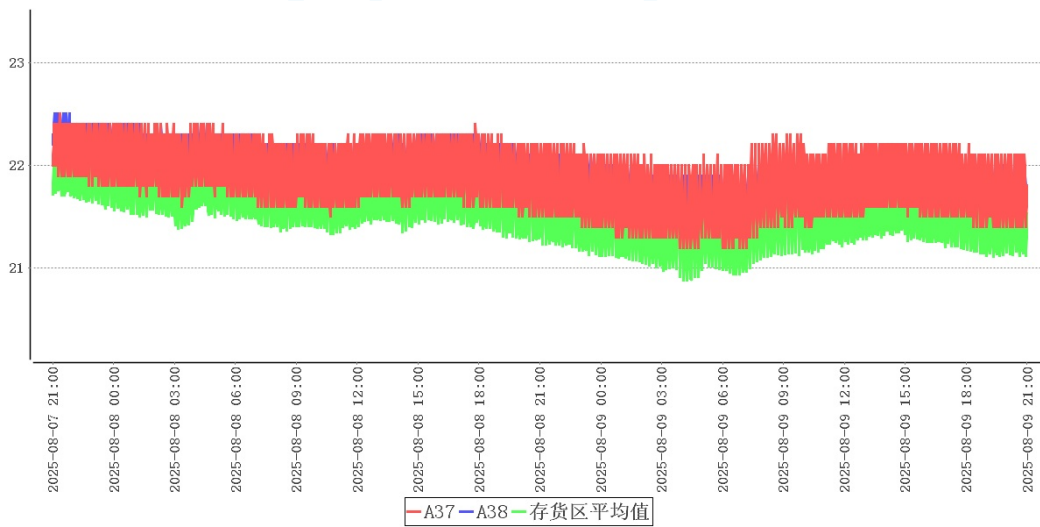

结合温度分布特性可得出以下表格：

冷点热点表


测点	最大值	最小值	平均值
A38	22.5	21.6	22.0
A05	22.5	20.3	21.4
货区点位	22.6	20.3	21.6

监测点位表

测点	最大值	最小值	平均值
A37	22.5	21.2	21.9
A38	22.5	21.6	22.0

结合库内高温敏感区、低温敏感区分析，库内热点为A38，库内冷点为A05。当前监测点位A38即热点敏感区，符合监测点位设置要求。当前监测点位A37温度与冷点温度在 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 准确度误差之内，符合监测点位设置要求。


11.5 监测点位安装位置精确度

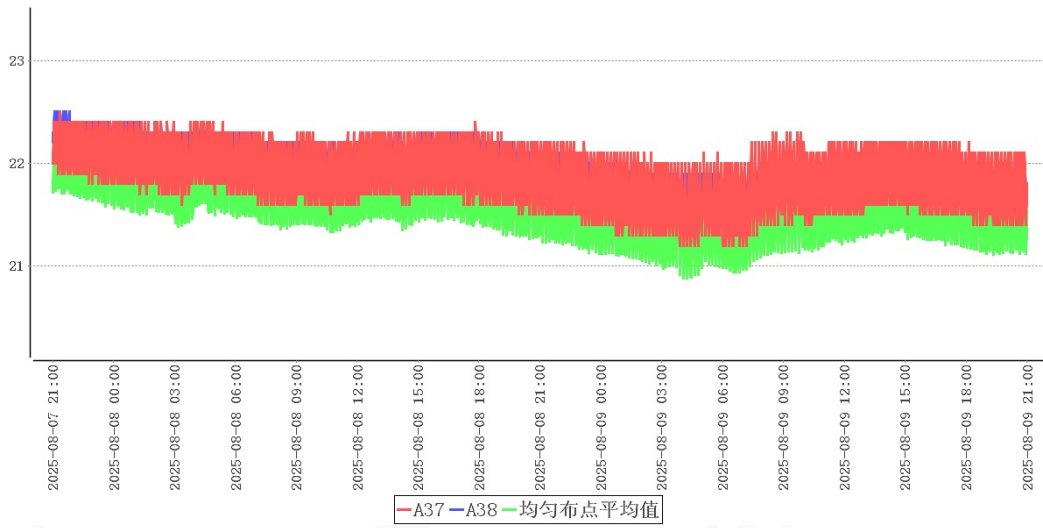

测点	最大值	最小值	平均值
A01	22.2	20.9	21.6
A02	22.2	20.3	21.4
A03	22.2	20.8	21.6
A04	22.1	20.6	21.4
A05	22.5	20.3	21.4
A06	22.4	20.7	21.6
A07	22.4	20.8	21.6
A08	22.4	21.1	21.8
A09	22.5	21.0	21.8
A10	22.2	20.9	21.6
A11	22.3	21.1	21.8
A12	22.2	21.0	21.6
A13	22.4	21.0	21.7
A14	22.5	20.4	21.5
A15	22.6	20.6	21.7
A16	22.4	20.7	21.6
A17	22.3	20.9	21.6
A37	22.5	21.2	21.9
A38	22.5	21.6	22.0
均匀布点	22.6	20.3	21.6

2处监测终端点位与验证用温度记录仪的差值在±1.0℃以内，能够代表全库平均温度及其波动，符合验证要求。

11.6 开关门验证

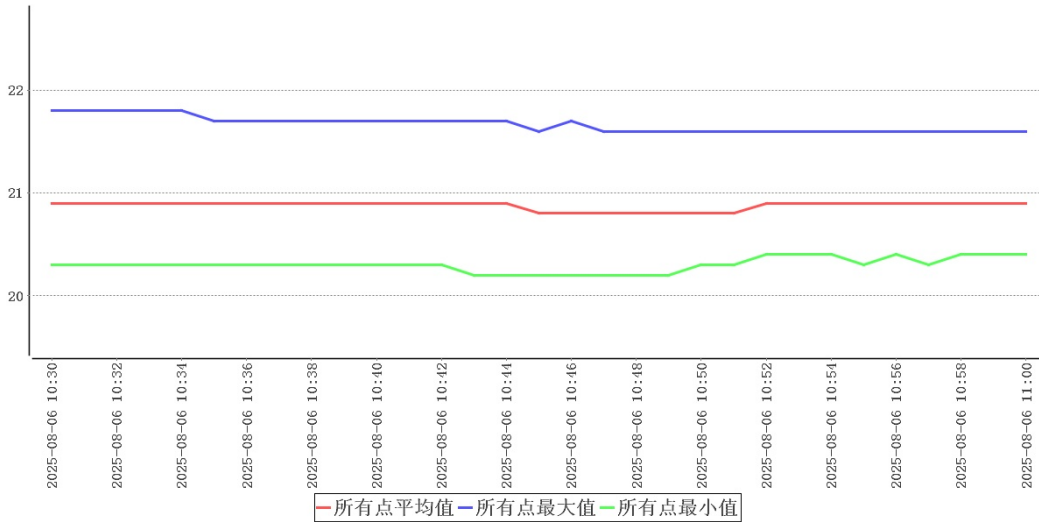

时间	所有点最大值	所有点最小值	所有点平均值	环境外温	备注
2025-08-06 10:30:00	21.8	20.3	20.9	31.6	开门
2025-08-06 10:31:00	21.8	20.3	20.9	31.6	
2025-08-06 10:32:00	21.8	20.3	20.9	31.7	
2025-08-06 10:33:00	21.8	20.3	20.9	31.7	
2025-08-06 10:34:00	21.8	20.3	20.9	31.8	
2025-08-06 10:35:00	21.7	20.3	20.9	31.9	
2025-08-06 10:36:00	21.7	20.3	20.9	31.9	
2025-08-06 10:37:00	21.7	20.3	20.9	32.0	
2025-08-06 10:38:00	21.7	20.3	20.9	32.0	
2025-08-06 10:39:00	21.7	20.3	20.9	32.1	
2025-08-06 10:40:00	21.7	20.3	20.9	32.1	
2025-08-06 10:41:00	21.7	20.3	20.9	32.1	
2025-08-06 10:42:00	21.7	20.3	20.9	32.1	
2025-08-06 10:43:00	21.7	20.2	20.9	32.2	
2025-08-06 10:44:00	21.7	20.2	20.9	32.1	
2025-08-06 10:45:00	21.6	20.2	20.8	32.1	


2025-08-06 10:46:00	21.7	20.2	20.8	32.1	
2025-08-06 10:47:00	21.6	20.2	20.8	32.1	
2025-08-06 10:48:00	21.6	20.2	20.8	32.1	
2025-08-06 10:49:00	21.6	20.2	20.8	32.1	
2025-08-06 10:50:00	21.6	20.3	20.8	32.2	
2025-08-06 10:51:00	21.6	20.3	20.8	32.3	
2025-08-06 10:52:00	21.6	20.4	20.9	32.4	
2025-08-06 10:53:00	21.6	20.4	20.9	32.3	
2025-08-06 10:54:00	21.6	20.4	20.9	32.3	
2025-08-06 10:55:00	21.6	20.3	20.9	32.4	
2025-08-06 10:56:00	21.6	20.4	20.9	32.5	
2025-08-06 10:57:00	21.6	20.3	20.9	32.6	
2025-08-06 10:58:00	21.6	20.4	20.9	32.6	
2025-08-06 10:59:00	21.6	20.4	20.9	32.6	
2025-08-06 11:00:00	21.6	20.4	20.9	32.7	关门

探头编号	最早恢复至接受标准时 温度(℃)	最早恢复至接受标准时 刻	恢复至接受标准最小时 长(分钟)
A01	N/A	N/A	N/A
A02	N/A	N/A	N/A
A03	N/A	N/A	N/A
A04	N/A	N/A	N/A
A05	N/A	N/A	N/A
A06	N/A	N/A	N/A
A07	N/A	N/A	N/A
A08	N/A	N/A	N/A
A09	N/A	N/A	N/A
A10	N/A	N/A	N/A
A11	N/A	N/A	N/A
A12	N/A	N/A	N/A
A13	N/A	N/A	N/A
A14	N/A	N/A	N/A

A15	N/A	N/A	N/A
A16	N/A	N/A	N/A
A17	N/A	N/A	N/A
A18	N/A	N/A	N/A
A19	N/A	N/A	N/A
A20	N/A	N/A	N/A
A21	N/A	N/A	N/A
A22	N/A	N/A	N/A
A23	N/A	N/A	N/A
A24	N/A	N/A	N/A
A25	N/A	N/A	N/A
A26	N/A	N/A	N/A
A27	N/A	N/A	N/A
A28	N/A	N/A	N/A
A29	N/A	N/A	N/A
A30	N/A	N/A	N/A
A31	N/A	N/A	N/A
A32	N/A	N/A	N/A
A33	N/A	N/A	N/A
A34	N/A	N/A	N/A
A35	N/A	N/A	N/A
A37	N/A	N/A	N/A
A38	N/A	N/A	N/A

门01开门测试共持续30分钟，在环境温度处于31.6℃~32.7℃情况下，各测点温度在20.2℃ (A32)~21.8℃ (A38)之间，未超出温控范围10.0℃~25.0℃。

11.7 设备故障或外部供电中断的状况下保温性能及变化趋势

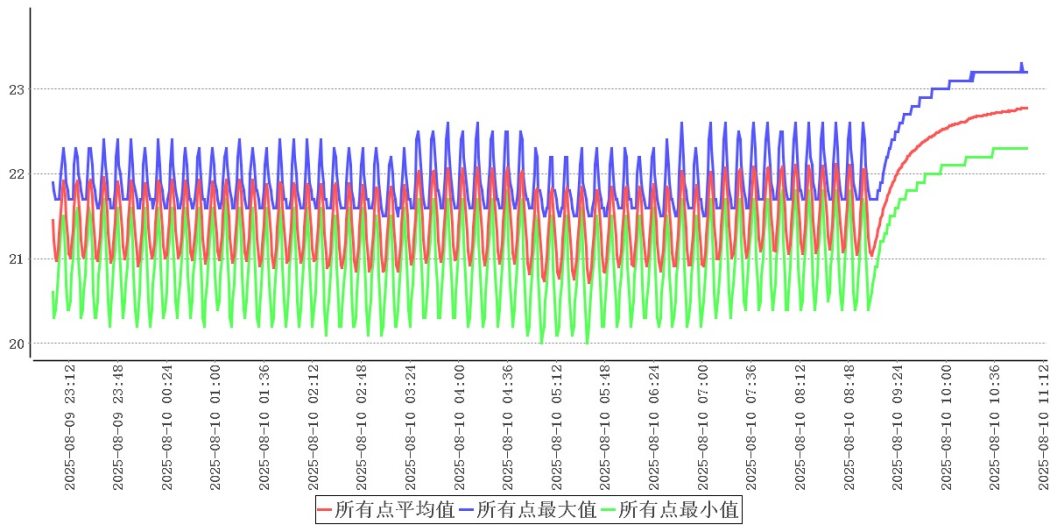

断电测试期间最高温度	23.2℃	测试时间	720分钟
断电测试期间最低温度	20.2℃	平均外温	25.2℃
升温最快的测点	A32	升温速率	0.003℃/分


探头编号	最晚维持在接受标准时温度(℃)	最早恢复至接受标准时刻	恢复至接受标准最小时长(分钟)
A01	N/A	N/A	N/A
A02	N/A	N/A	N/A
A03	N/A	N/A	N/A
A04	N/A	N/A	N/A
A05	N/A	N/A	N/A
A06	N/A	N/A	N/A
A07	N/A	N/A	N/A
A08	N/A	N/A	N/A
A09	N/A	N/A	N/A
A10	N/A	N/A	N/A
A11	N/A	N/A	N/A
A12	N/A	N/A	N/A
A13	N/A	N/A	N/A
A14	N/A	N/A	N/A
A15	N/A	N/A	N/A
A16	N/A	N/A	N/A

A17	N/A	N/A	N/A
A18	N/A	N/A	N/A
A19	N/A	N/A	N/A
A20	N/A	N/A	N/A
A21	N/A	N/A	N/A
A22	N/A	N/A	N/A
A23	N/A	N/A	N/A
A24	N/A	N/A	N/A
A25	N/A	N/A	N/A
A26	N/A	N/A	N/A
A27	N/A	N/A	N/A
A28	N/A	N/A	N/A
A29	N/A	N/A	N/A
A30	N/A	N/A	N/A
A31	N/A	N/A	N/A
A32	N/A	N/A	N/A
A33	N/A	N/A	N/A
A34	N/A	N/A	N/A
A35	N/A	N/A	N/A
A37	N/A	N/A	N/A
A38	N/A	N/A	N/A

本次测试共进行720分钟，变化速率最快的点为A32，升温速率为0.003℃/分，由此速率可计算出此点再有720分钟就会达到温度上限25.0℃。因此外部温度25.2℃时，遇到异常情况时，需在1440分钟内恢复供电，如不能及时恢复供电，需要对库内药品做转库处理。

11.8 本地区的高温或低温等极端外部环境条件下保温效果评估

外部温度	最大值	最小值	采集次数	平均值
仓库室外温度	33.8	21.2	2880次	26.4

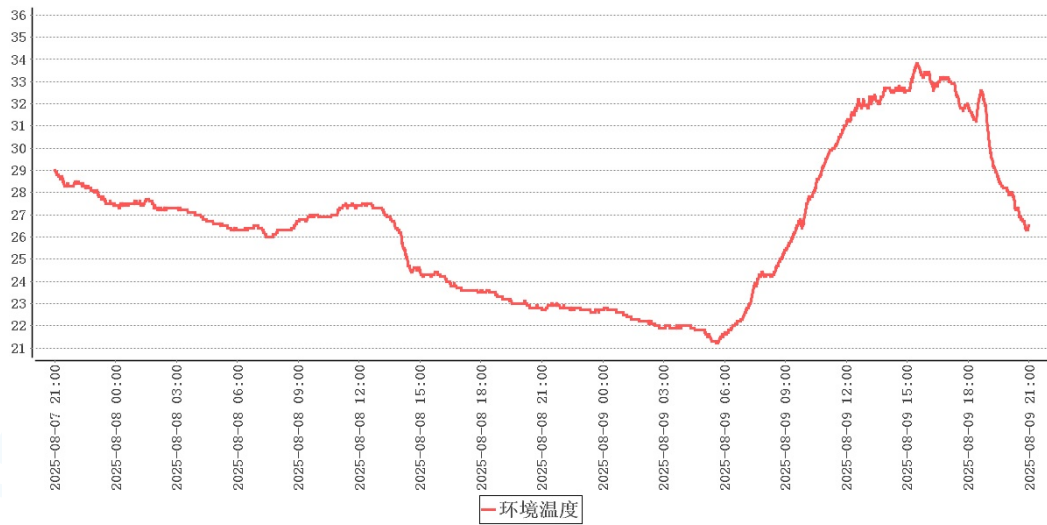

本次验证实施期间库外温度 $21.2^{\circ}\text{C} \sim 33.8^{\circ}\text{C}$ ，各项验证结论可视为极热验证，建议在本地区的低温环境下再次实施极寒验证。

12 偏差处理

无

13 验证结论

序号	项目名称	结论
1	本地区的高温或低温等极端外部环境条件下的温度保障能力确认	本次验证实施期间库外温度 $21.2^{\circ}\text{C} \sim 33.8^{\circ}\text{C}$ ，各项验证结论可视为极热验证，建议在本地区的低温环境下再次实施极寒验证。
2	温度监测系统配置的测点终端安装位置确认	结合库内高温敏感区、低温敏感区分析，库内热点为A38，库内冷点为A05。当前监测点位A38即热点敏感区，符合监测点位设置要求。当前监测点位A37温度与冷点温度在 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 准确度误差之内，符合监测点位设置要求。
3	温度自动监测系统测点的准确度测试	2处监测终端点位与验证用温度记录仪的差值在 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 以内，能够代表全库平均温度及其波动，符合验证要求。

4	温度分布特性的测试与分析	在库房空调或制冷系统温度控制参数符合设定要求、库房温度符合设定范围后，数据有效持续采集时间为48小时0分钟，在环境温度处于21.2℃~33.8℃情况下，库内各测点温度在20.1℃(A32)~22.6℃(A15, A19, A21, A31, A33)之间，未超出温控范围10.0℃~25.0℃。根据《GBT34399-2017医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范》附录A计算方法，温度偏差 $\Delta t_d = t_d - t_o = -0.6^\circ\text{C}$ 、波动度 $\Delta t_f = \pm (t_{\text{max}} - t_{\text{min}}) / 2 = 0.7^\circ\text{C}$ 、均匀度 $\Delta t_u = \sum (t_{\text{imax}} - t_{\text{imin}}) / n = 0.9^\circ\text{C}$ ，可知偏差、均匀度、波动度各项数值不高于 $\pm 3^\circ\text{C}$ ，符合国标要求。
5	温控设施设备运行参数及使用状况测试-参数测试	在当前设置的工作条件下，库内温度在20.1℃~22.6℃之间，符合10.0℃~25.0℃验证标准。
6	湿度分布特性的测试与分析	从各监测点相对湿度数据分布图可以看出：库内各点湿度处于56.3%(A09)~73.9%(A14)之间变化，湿度平均值处于61.4%(A09)~66.8%(A11)之间，符合相对湿度10.0%~75.0%要求。
7	湿度分布特性的测试与分析	从各监测点相对湿度数据分布图可以看出：库内各点相对湿度平均值差别较大，建议增加除湿设备进行除湿。
8	确定设备故障或外部供电中断的状况下库房保温性能及变化趋势	本次测试共进行720分钟，变化速率最快的点为A32，升温速率为0.003℃/分，由此速率可计算出此点再有720分钟就会达到温度上限25.0℃。因此外部温度25.2℃时，遇到异常情况时，需在1440分钟内恢复供电，如不能及时恢复供电，需要对库内药品做转库处理。
9	开门作业对库房温度分布的影响	门01开门测试共持续30分钟，在环境温度处于31.6℃~32.7℃情况下，各测点温度在20.2℃(A32)~21.8℃(A38)之间，未超出温控范围10.0℃~25.0℃。

14 报告确认

经验证小组审批，各项确认结果均符合标准要求，批准投入使用，特此声明。

确认项目名称：福元_零头库_22E018高温满载验证

负责人 _____

15 再次验证周期

1. 在一般正常使用情况下，每五年再验证一次。
2. 遇任何重大变更，需要再次验证，以证明各种重大变更不会对现有使用效果产生影响：
 - (1) 设备移动安装地点或位置
 - (2) 重要配套设备变更或进行重大维修项目
 - (3) 设备性能参数应用超出本验证范围

合格证

CERTIFICATE



使用单位: 北京福元医药股份有限公司

验证对象: 福元_零头库_22E018

验证日期: 2025年08月10日

验证结果: 合格

验证类型: 定期验证



北京世福宝科技有限公司

公司网址: <http://www.sevobo.com>

Beijing SEVOBO Technology Co., Ltd

公司地址: 北京市通州区马驹桥联东U谷西区11B
