



GMP验证报告

GMP VERIFICATION REPORT

验证企业: 北京福元医药股份有限公司

验证地址: 北京通州区漷城西三路与漷兴西四街交叉口西北320米

验证对象: 福元_不合格品库_7#

温控信息: 10.0℃~20.0℃

验证性质: 使用前验证

验证环境: 常温

验证类别: 空载

验证项目:
确定设备故障或外部供电中断的状况下库房保温性能及变化趋势
温度分布特性的测试与分析
温度监测系统配置的测点终端安装位置确认
开门作业对库房温度分布的影响
本地区的高温或低温等极端外部环境条件下的温度保障能力确认

验证实施日期:

签发:

签发日期:

验证标准和技术要求:

依照《WHO第961号技术报告附录9: 时间和温度敏感的药品的贮运指南技术补充之温控存贮区的确认》、《药品生产质量管理规范(2019年修订)》、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》(GSP)及附录五《验证管理》、《GBT34399-2017医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范的要求》。

适用范围:

冷库及全部温湿度调节设施。

北京世福宝科技有限公司

Beijing SEVOBO Technology Co., Ltd



系统名称及版本号: 世福宝GSP/GMP冷链物流温控验证实时云系统 V1.0

公司地址: 北京市通州区马驹桥联东U谷西区11B

公司电话: 13021079718, 18610356318

公司网址: <http://www.sevobo.com>

本报告本由北京世福宝科技有限公司出具, 不得涂改、转让。北京世福宝科技有限公司拥有最终解释权。
获报告组织必须定期接受监督审核并经审核合格方可保持报告有效。

目录

1 参与人员及培训记录.....	3
1.1 验证报告的起草、审核与批准.....	3
1.2 验证参与人员.....	3
1.3 培训记录.....	4
2 验证目的.....	4
3 验证依据.....	4
4 验证规程.....	4
5 本次验证所用主要测量设备.....	4
5.1 验证设备标准.....	4
5.2 验证设备描述.....	5
5.3 验证设备清单.....	5
6 验证对象.....	9
6.1 对象说明.....	9
7 验证实施前准备及检查.....	10
7.1 系统条件确认.....	10
7.2 文件要求确认.....	10
7.3 验证用记录仪检验确认.....	11
7.4 环境卫生确认.....	11
7.5 人员培训确认.....	11
8 安装确认.....	12
8.1 技术资料检查.....	12
8.2 安装位置检查.....	13
8.3 设备外观检查.....	13
8.4 设备电器部分检查.....	13
9 运行确认.....	14
9.1 检查确认以下各项功能控制的稳定性和可靠性.....	14

9.2 检查确认该设备在运行时各项控制（技术）参数是否符合要求.....	14
10 性能确认.....	15
10.1 布点依据.....	15
10.2 测点布置.....	15
10.2.1 布点示意图.....	15
10.2.2 布点位置详表.....	16
10.2.3 现场照片.....	18
11 验证项目实施.....	19
11.1 温度分布特性测试.....	19
11.2 湿度分布特性.....	19
11.3 温度自动监测设备安装位置确认.....	19
11.4 开关门验证.....	19
11.5 设备故障或外部供电中断的状况下保温性能及变化趋势.....	20
11.6 本地区的高温或低温等极端外部环境条件下保温效果评估.....	20
12 偏差处理.....	20
13 验证结论.....	20
14 报告确认.....	20
15 再次验证周期.....	20

1 参与人员及培训记录

1.1 验证报告的起草、审核与批准

职责	姓名	职务	企业	签名
起草	李代万	经理	北京世福宝科技有限公司	
校对	王飞	验证专员	北京世福宝科技有限公司	
审核	金澜	验证管理部负责人	北京福元医药股份有限公司	
审核	李天	质量保证部	北京福元医药股份有限公司	
审核	张富源	储运部经理	北京福元医药股份有限公司	
审核	杨磊	设备动力部总监	北京福元医药股份有限公司	
审核	刘年永	生产总监	北京福元医药股份有限公司	
批准	贾俊	质量负责人	北京福元医药股份有限公司	

1.2 验证参与人员

职责	姓名	职务	企业	签名
组长	贾俊	质量负责人	北京福元医药股份有限公司	
副组长	李代万		北京世福宝科技有限公司	
副组长	****		北京福元医药股份有限公司	
组员	王飞		北京世福宝科技有限公司	
组员	王猛		北京世福宝科技有限公司	
组员	居文贤		北京世福宝科技有限公司	

组员	郝晓雅		北京世福宝科技 有限公司	
----	-----	--	-----------------	--

1.3 培训记录

2 验证目的

1. 建立阴凉库温湿度验证方案，检查并确认阴凉库内温湿度计放置是否合理，证明阴凉库是否能达到规定的温度和湿度的要求。
2. 对阴凉库日常监控点的位置确认
3. 阴凉库温度分布均匀度的确认，验证该库能够达到设定的温度要求，从而满足GMP管理要求。

3 验证依据

1. WHO第961号技术报告附录9：时间和温度敏感的药品的贮运指南技术补充之温控存贮区的确认》；
2. 《药品生产质量管理规范（2019年修订）》；《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》；《药品经营质量管理规范》（GSP）及附录五《验证管理》、《GBT34399-2017医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范的要求》。
3. 验证实施标准：
 - （1）成品阴凉库的温度控制范围：<20℃。
 - （2）成品阴凉库的湿度控制范围：45%-75%。

4 验证规程

1. 概述：部分成品或者物料在贮存的过程中，有温湿度的要求，在成品或者物料贮存过程中，仓库的温湿度是否符合成品或者物料贮存的要求，需进行验证。
2. 验证目的要求
 - （1）检查资料 and 文件是否符合GMP管理要求。
 - （2）检查并确认成品阴凉库空调安装是否符合设计要求。
 - （3）检查并确认成品阴凉库空调运行是否符合设计要求。
 - （4）检查并确认成品阴凉库温度和湿度是否符合《WHO第961号技术报告附录9：时间和温度敏感的药品的贮运指南技术补充之温控存贮区的确认》仓储要求。

5 本次验证所用主要测量设备

5.1 验证设备标准

1. 用于检测成品阴凉库的温湿度传感器需经过合法的校验，并具有合格证书。
2. 验证所使用的温度传感器应当适用被验证设备的测量范围，温度测量范围在-10℃-45℃之间，温度的最大允许误差为±0.5℃；湿度测量范围在0%-95%之间，湿度的最大允许误差为±3%。

5.2 验证设备描述

型号	品牌	温度测量范围	温度精度	湿度测量范围	湿度精度
SVB-YZ-HOST	世福宝	-30° C~75° C	+0.5° C ($\geq 0^{\circ}\text{C}$ 时); $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($< 0^{\circ}\text{C}$ 时)	0%-95%	$\pm 3\%$
SVB-YZ-REC-1	世福宝	-30° C~75° C	+0.5° C ($\geq 0^{\circ}\text{C}$ 时); $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($< 0^{\circ}\text{C}$ 时)	0%-95%	$\pm 3\%$
SVB-YZ-REC-02	世福宝	-30° C~75° C	+0.5° C ($\geq 0^{\circ}\text{C}$ 时); $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($< 0^{\circ}\text{C}$ 时)	0%-95%	$\pm 3\%$
SVB-YZ-REC-03	世福宝	-30° C~75° C	+0.5° C ($\geq 0^{\circ}\text{C}$ 时); $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($< 0^{\circ}\text{C}$ 时)	0%-95%	$\pm 3\%$

5.3 验证设备清单

型号	设备号	校准单位	校准证书	有效期	校准结果
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60881198 03	山东省计量科学研究院	24001165 249	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61485468 03	山东省计量科学研究院	24001166 869	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61484108 03	山东省计量科学研究院	24001166 845	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60882948 03	山东省计量科学研究院	24001166 732	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61481288 03	山东省计量科学研究院	24001166 766	2025-12-04	合格

SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61483068 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 818	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61483328 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 825	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61486868 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 902	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61485538 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 872	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61481278 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 765	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60881128 03	山东省计 量科学研 究院	24001165 246	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60280108 03	山东省计 量科学研 究院	24001165 203	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61481178 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 762	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60280578 03	山东省计 量科学研 究院	24001165 222	2025-12-04	合格

SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61485018 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 859	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61480078 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 735	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61486598 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 898	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80880608 03	山东省计 量科学研 究院	24001165 025	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80880368 03	山东省计 量科学研 究院	24001165 001	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80880098 03	山东省计 量科学研 究院	24001164 974	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80280408 03	山东省计 量科学研 究院	24001164 965	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-01	SF308010 10021240 80280248 03	山东省计 量科学研 究院	24001164 949	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60881638 03	山东省计 量科学研 究院	24001165 257	2025-12-04	合格

SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61483778 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 836	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60881178 03	山东省计 量科学研 究院	24001165 248	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61484918 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 857	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61480208 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 738	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61480248 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 740	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61480978 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 756	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61485708 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 877	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61482358 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 803	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61481148 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 760	2025-12-04	合格

SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60882908 03	山东省计 量科学研 究院	24001165 198	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61481248 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 763	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61483308 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 824	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61484378 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 850	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 61481388 03	山东省计 量科学研 究院	24001166 773	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60882308 03	山东省计 量科学研 究院	24001165 178	2025-12-04	合格
SVB-YZ-REC-02	SF304070 10002230 60882488 03	山东省计 量科学研 究院	24001165 187	2025-12-04	合格

6 验证对象

6.1 对象说明

名称	福元_不合格品库_7#
编号	福元_不合格品库_7#
长宽高(mm)	8m*6.53m*4.5m
面积(平米)	52.24
验证范围	10.0℃~20.0℃

验证状态	使用前
------	-----

7 验证实施前准备及检查

7.1 系统条件确认

空调设备及仓库设计图情况确认表

序号	确认对象	检查标准	存放部门	确认结论
1	仓库平面布置图	应有	工程设备安全部	
2	仓库平面布置设计说明	应有	工程设备安全部	
3	空调运行	可运行	成品阴凉库	

检查人	
复核人	
确认结果	
确认人/日期	

7.2 文件要求确认

验证用相关文件确认表

序号	文件名称	文件编号	起草人	审核人	批准人	执行日
1	仓储管理规程					
2	仓库卫生管理规程					
3	物料储存管理规程					
4	成品入库储存发放管理规程					
5	阴凉库管理规程					
6	仓库温湿度管理规程					
7	仓库清洁标准操作规程					
8	立式空调使用标准操作规程					
9	温度记录仪使用标准操作规程					

检查人	
复核人	
确认结果	
确认人/日期	

7.3 验证用记录仪检验确认

验证用记录仪校验情况确认表

序号	检查项目	合格要求	检查结论
1	记录仪校准证书	有效期内	
2	开机、记录、状态	应正常、清晰	

检查人	
复核人	
确认结果	
确认人/日期	

7.4 环境卫生确认

阴凉库环境卫生情况确认表

序号	检查项目	检查标准	确认结果
1	地面	应整洁、干净	
2	门、窗、墙壁、天棚	应整洁、干净	
3	设备、设施表面	应清洁、干净	
4	其它	应清洁、干净	

检查人	
复核人	
确认结果	
确认人/日期	

7.5 人员培训确认

参加验证人员培训确认表

序号	文件名称	文件编号	培训日期
1	仓储管理规程		
2	仓库卫生管理规程		
3	物料储存管理规程		
4	成品入库储存发放管理规程		
5	阴凉库管理规程		
6	仓库温湿度管理规程		
7	仓库清洁标准操作规程		
8	立式空调使用标准操作规程		
9	验证用记录仪使用标准操作规程		

检查人	
复核人	
确认结果	
确认人/日期	

8 安装确认

8.1 技术资料检查

设备随机资料检查表

序号	资料名称	页数	份数	存放部门	检查结论
1	设备说明书		1	工程设备安全部	
2	产品合格证		1	工程设备安全部	
3	装箱单		1	工程设备安全部	
4	设备图纸		1	工程设备安全部	
5	开箱验收记录		1	工程设备安全部	
6	设备安装检查记录		1	工程设备安全部	

检查人	
复核人	

文件编号：

评定结果	
评定人/日期	

8.2 安装位置检查

设备安装位置检查情况表

序号	设备名称	安装位置	安装要求	检查结论
1	立式空调	成品阴凉库	使设备保持水平	
2	主机的后侧离墙距离	成品阴凉库	≥0.2M	
3	主机两侧离墙距离	成品阴凉库	≥0.2M	

检查人	
复核人	
评定结果	
评定人/日期	

8.3 设备外观检查

设备外观检查情况表

序号	检查项目	合格要求	检查结论
1	机身	完好	
2	油漆	无脱落	
3	控制面板	表面完好	
4	配套管线	连接符合要求	

检查人	
复核人	
评定结果	
评定人/日期	

8.4 设备电器部分检查

设备电器部分检查情况表

序号	检查项目	合格要求	检查结论

1	电源	AC50HZ380V	
2	摇控器/控制面板	灵敏	
3	接地装置	应有接地线路	

检查人	
复核人	
评定结果	
评定人/日期	

9 运行确认

在安装确认完成，以及其他相关配套条件具备后，即可进行该设备的运行确认。按照设备操作SOP对此设备进行试运行，检查其运行情况是否良好，各项指标是否达到预定的要求。

9.1 检查确认以下各项功能控制的稳定性和可靠性

操作控制系统功能检查记录表

序号	检查项目	要求	结果
1	电源 符合要求	安全可靠	合格
2	开关	控制功能方便可靠	合格
3	控制面板或摇控器	传感灵敏度	合格
4	开关机运行	应正常	合格

检查人	
复核人	
评定结果	
评定人/日期	

9.2 检查确认该设备在运行时各项控制（技术）参数是否符合要求

设备运行参数检查记录表

序号	操作内容	操作标准	结果
1	最低温度运行	$\geq 17^{\circ} \text{C}$	合格
2	最高温度运行	$\leq 30^{\circ} \text{C}$	合格

3	除湿功能运行	湿度>75%	合格
4	自动功能运行	17° C≤温度≤30°C	合格
5	降温设定	≤19° C	合格

检查人	
复核人	
评定结果	
评定人/日期	


10 性能确认

10.1 布点依据

- 1、在仓库内一次性同步布点，确保各测点采集数据的同步、有效；
- 2、每个库房中均匀性布点数量不应少于9个，仓间各角及中心位置均应布置测点，每两个测点的水平间距不应大于5m，垂直间距不应超过2m。
- 3、库房每个作业出入口及风机出风口区域至少布置5个测点，库房中每组货架或建筑结构的风向死角位置至少应布置3个测点。
- 4、特殊区域应布设温度监测点，包括空调或制冷设备回风位置、温度自动监测系统测点终端安装位置、门、窗、灯等位置。
- 5、温度监测点均应布设在货位上或货物可能存放的位置。

10.2 测点布置

10.2.1 布点示意图

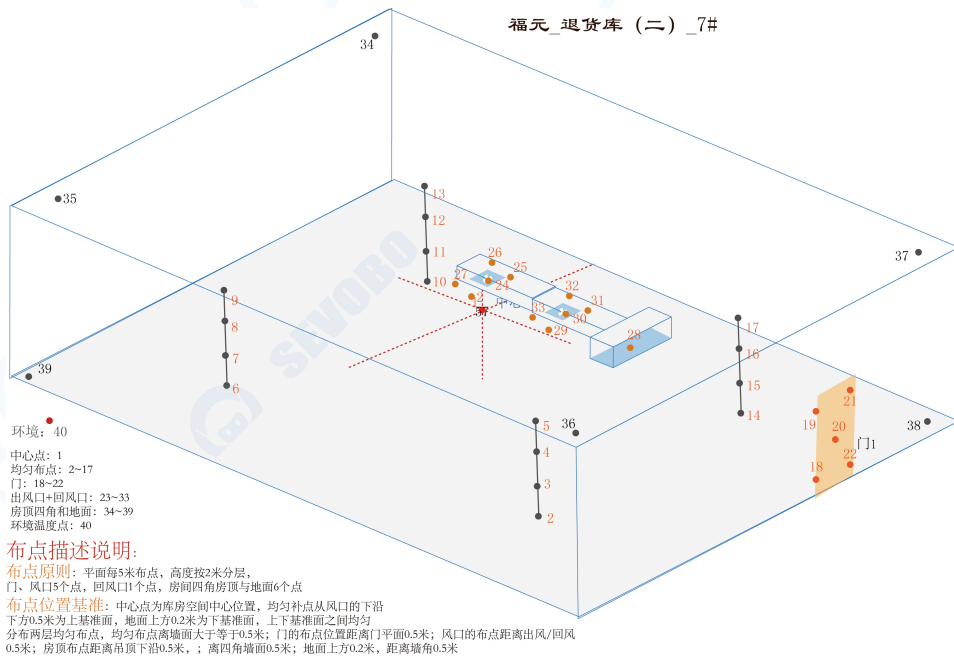

布点示意图

10.2.2 布点位置详表

名称	位置编码	类型	设备型号	设备编号
中心点1	A01	中心点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088119803
均匀布点2	A02	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148546803
均匀布点3	A03	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148410803
均匀布点4	A04	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088294803
均匀布点5	A05	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148128803
均匀布点6	A06	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148306803
均匀布点7	A07	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148332803
均匀布点8	A08	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148686803

均匀布点9	A09	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148553803
均匀布点10	A10	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148127803
均匀布点11	A11	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088112803
均匀布点12	A12	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306028010803
均匀布点13	A13	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148117803
均匀布点14	A14	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306028057803
均匀布点15	A15	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148501803
均匀布点16	A16	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148007803
均匀布点17	A17	均匀布点	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148659803
门23	A23	门	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408088060803
门24	A24	门	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408088036803
门25	A25	门	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408088009803
门26	A26	门	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408028040803
门27	A27	门	SVB-YZ-REC-01	SF308010100212 408028024803
回风口28	A28	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088163803
出风口29	A29	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148377803
出风口30	A30	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088117803

出风口31	A31	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148491803
出风口32	A32	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148020803
出风口33	A33	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148024803
出风口34	A34	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148097803
出风口35	A35	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148570803
出风口36	A36	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148235803
出风口37	A37	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148114803
出风口38	A38	风机	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088290803
房顶39	A39	风向死角	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148124803
房顶40	A40	风向死角	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148330803
房顶41	A41	风向死角	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148437803
房顶42	A42	风向死角	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306148138803
地面43	A43	风向死角	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088230803
地面44	A44	风向死角	SVB-YZ-REC-02	SF304070100022 306088248803
环境外温45	A45	环境外温		

10.2.3 现场照片

文件编号:



11 验证项目实施

11.1 温度分布特性测试

11.1.1 温度分布特性

11.2 湿度分布特性

11.2.1 库内各点相对湿度

11.3 温度自动监测设备安装位置确认

11.4 开关门验证

11.5 设备故障或外部供电中断的状况下保温性能及变化趋势

11.6 本地区的高温或低温等极端外部环境条件下保温效果评估

12 偏差处理

无

13 验证结论

序号	项目名称	结论
----	------	----

14 报告确认

经验证小组审批，各项确认结果均符合标准要求，批准投入使用，特此声明。

确认项目名称：福元_不合格品库_7#常温空载验证

负责人 _____

15 再次验证周期

1. 在一般正常使用情况下，每五年再验证一次。
2. 遇任何重大变更，需要再次验证，以证明各种重大变更不会对现有使用效果产生影响：
 - (1) 设备移动安装地点或位置
 - (2) 重要配套设备变更或进行重大维修项目
 - (3) 设备性能参数应用超出本验证范围

合格证

CERTIFICATE



使用单位: 北京福元医药股份有限公司

验证对象: 福元_不合格品库_7#

验证类型: 使用前验证

验证日期: 2024年12月24日

验证结果: 合格



北京世福宝科技有限公司

公司网址: <http://www.sevobo.com>

Beijing SEVOBO Technology Co., Ltd

公司地址: 北京市通州区马驹桥联东U谷西区11B
